



II.4 ESTUDIOS TÉCNICOS (ART. 21 F. X, LOPSRM)

000063

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.




Coquimatlán, Colima a 25 de Marzo de 2016.

DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

Con fundamento y apego al artículo 20 de la Ley Estatal de Obras Públicas, se considera que con la realización del proyecto **“Pavimentación concreto y adoquín calle 12 de octubre entre 20 de noviembre e Hidalgo carril Sur”**, Los impactos ambientales asociados a las fases de sustitución de huellas de rodamiento, puede ser asimilada por el entorno debido a los asentamientos humanos existentes en la localidad, por lo que no habrá una alteración al paisaje, calidad del medio ambiente y uso del suelo.

ATENTAMENTE

JORGE MACIAS



ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONSTITUCIONAL DE
COQUIMATLAN, COL.
2015-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

000069

**OPERADO
FORTALECE**

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social”

Presidencia Municipal



I.4 DICTAMEN DE IMPACTO SOCIAL

000015

"2017, CÉNTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.



Coquimatlán, Colima a 26 de Mayo de 2016.

DICTAMEN DE IMPACTO SOCIAL

Con fundamento y apego en lo dispuesto en el Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se menciona que: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar". Por lo que se plantea la **"Pavimentación concreto y adoquín calle 12 de Octubre entre 20 de Noviembre e Hidalgo carril sur"** específicamente sobre las calles mencionadas. Se hace constatar que los recursos destinados beneficiarán directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social, ya que esta es una necesidad básica para las familias beneficiadas.

Atentamente



JORGE MACÍAS

ING. JORGE ALEJANDRO MACÍAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

COLEGIO MUNICIPAL
COQUIMATLÁN, COL.
2015-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

**OPERADO
FORTALECE**

000016

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.



III.2 CONVOCATORIA PÚBLICA (ART. 31, 32 LOPSRM)



000176

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.

DOF: 13/09/2016

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LICITACION PUBLICA NACIONAL
RESUMEN DE CONVOCATORIA 002

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional No. LO-806004996-E7-2016, No. LO-806004996-E8-2016, No. LO-806004996-E9-2016 y No. LO-806004996-E10-2016. Cuya convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx>, o bien en: Calle Reforma y Jesús Alcaraz S/N Col. Centro, C.P. 28400, Tel: 01 312 32 30333 en Coquimatlán, Colima, los días del 13 de septiembre al 27 de septiembre del año en curso de 10:00 a 14:00 horas.

Licitación Pública Nacional No. LO-806004996-E7-2016

Descripción	Pavimentación Concreto y Adoquín. Calle 12 de Octubre entre 20 de Noviembre e Hidalgo Carril Norte.
Volumen a adquirir	Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de Publicación en CompraNET	13/09/2016
Junta de Aclaraciones	20/09/2016, 10:00 hrs.
Visita al lugar de la Obra	20/09/2016, 09:00 hrs.
Presentación y apertura de proposiciones	27/06/2016, 10:00 hrs.

Licitación Pública Nacional No. LO-806004996-E8-2016

Descripción	Pavimentación Concreto y Adoquín. Calle 12 de Octubre entre 20 de Noviembre e Hidalgo Carril Sur.
Volumen a adquirir	Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de Publicación en CompraNET	13/09/2016
Junta de Aclaraciones	20/09/2016, 12:00 hrs.
Visita al lugar de la Obra	20/09/2016, 11:00 hrs.
Presentación y apertura de proposiciones	27/09/2016, 08:00 hrs.

Licitación Pública Nacional No. LO-806004996-E9-2016

Descripción	Pavimentación concreto y adoquín Calle Torres Núñez
Volumen a adquirir	Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de Publicación en CompraNET	13/09/2016
Junta de Aclaraciones	20/09/2016, 14:00 hrs.
Visita al lugar de la Obra	20/09/2016, 13:00 hrs.
Presentación y apertura de proposiciones	27/09/2016, 12:00 hrs.

Licitación Pública Nacional No. LO-806004996-E10-2016

Descripción	Sustitución Drenaje y Agua Potable. Calle 12 de Octubre y Torres Núñez.
Volumen a adquirir	Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de Publicación en CompraNET	13/09/2016
Junta de Aclaraciones	20/09/2016, 16:00 hrs.

**OPERADO
FORTALECE**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

000177

Visita al lugar de la Obra	20/09/2016, 15:00 hrs.
Presentación y apertura de proposiciones	27/09/2016, 14:00 hrs.

Licitación Pública Nacional No. LO-806004996-E11-2016

Descripción	Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia Jardines del Llano.
Volumen a adquirir	Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de Publicación en CompraNET	14/09/2016
Junta de Aclaraciones	21/09/2016, 11:00 hrs.
Visita al lugar de la Obra	21/09/2016, 10:00 hrs.
Presentación y apertura de proposiciones	28/09/2016, 09:00 hrs.

COQUIMATLAN, COL., A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, COL.

LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS

RUBRICA.

(R.- 437385)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

**OPERADO
FORTALECE**

000173



III.3 BASES DE CONCURSO (ART. 34 LOPSRM)



000179

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

Licitantes Invitados

1148783

PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HI 008 745823

PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HI

ALMA GUADALUPE DENIZ BENITEZ	Coquimatlán	MEXICO	DEBA861208GL6	523123174299
ARCOCUB S DE RL DE CV	COLIMA	MEXICO	ARC1907232E6	52 31 23235200
CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV	VILLA DE ALVAREZ	MEXICO	CTAD10202QM2	523123965795
CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO SA DE CV	COLIMA	MEXICO	CDC120123PG5	523123172365
CONSTRUCCIONES MARAL FD SA DE CV	Coquimatlán	MEXICO	CMF160118NU6	52 312 1590952
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA SA DE CV	ARMERIA	MEXICO	CEA0909151F4	013133222002
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV	Colima	MEXICO	CSA06091.1558	013123086713
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLIMA SA DI Villa de Alvarez	COLIMA	MEXICO	CSI1007028W3	55 312 330 8358
CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA SA DE CV	Colima	MEXICO	CVC890523781	013123147722
CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS GENEVAL SA DE CV	Colima	MEXICO	CAG151005AM0	313 139 06.02
FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN	Manzanillo	MEXICO	CABF810910J21	(314)33 36463
HECTOR GODINA RODRIGUEZ	COLIMA	MEXICO	GORH881113QJ5	55 312 3075841
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES OCC Colima	cuahuteemoc colima	MEXICO	IMC140428B51	013123155986
J JESUS AMEZCUA ESPINOZA	COLIMA	MEXICO	AEEL5706245Z4	3121428743
JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	ARMERIA	MEXICO	PISJ810312BF6	52 312 3147331
JAIME MORFIN ROBLES	MANZANILLO	MEXICO	MORJ700829770	3133222002
JOSE ROBERTO ROCHA CASTILLO	COLIMA	MEXICO	ROCR841130DU0	3143365845
JOSE TLACAELEL NEGRETE MICHEL	COLIMA	MEXICO	NEMT900930NR3	523121571068
MARIANO ALBERTO MICHEL LOPEZ	COLIMA	MEXICO	MILM770801JR6	013123133868
MARIO LUCAS CRISTOBAL	ZOQUITLAN	MEXICO	LUCM860626559	3121632636
METROVIA DESARROLLOS SA DE CV	COLIMA	MEXICO	MDE1402284N7	523121662004
MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN	Coquimatlán	MEXICO	VECM911105TL9	523123129505
MIGUEL RAMIREZ GALINDO	VILLA DE ALVAREZ	MEXICO	RAGM881006548	523121651446
PROYECTOS VIABLES Y CONSTRUCCION SA DE CV	COLIMA	MEXICO	PVC1404087P6	312-313-5618
RALAD SA DE CV	COLIMA	MEXICO	RAL080806HR6	3123021808
THICSA SCC SA DE CV	Villa de Alvarez	MEXICO	TSC1502042V3	

081090



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COJIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LO-806004996-ES-2016



DISPOSICIONES GENERALES

CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 115/SIM/04/996-EW-2016. PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO, INGRESADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (COMPRANET) DEL 13 SEPTIEMBRE 2016. EN LA CUAL SE ESTABLECERAN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARA EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBEN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION.

De acuerdo con la Convocatoria de fecha 13 SEPTIEMBRE 2016 para participar en el PROCESO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 110/SIM/04/996-ES-2016, mediante el procedimiento establecido en los Artículos 27, fracción II y 30, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; inherentes a la ejecución de los trabajos antes mencionados. A continuación se establecen los licitamientos que los licitantes deberán tomar en consideración para la formulación de la proposición y celebración de los actos correspondientes.

PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES.

Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de ésta licitación pública nacional, en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Coahuila, ubicadas en Calle Reforma y J. Jesús Alcaraz s/n, colonia Centro de la cabecera municipal de Coahuila, Coah y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Dirección de Obras Públicas de Coahuila se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

- I. Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración de este procedimiento de contratación;
- II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública, la que deberá ser solicitada por el licitante interesado ante el titular del órgano interno de control en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila, en un plazo de cuando menos ocho días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. El Órgano Interno de Control resolverá lo procedente, atendido a las características del objeto del contrato que se adjudicará, así como su correlación con las circunstancias que lo vinculan con los servidores públicos, y podrá tomar en cuenta todos aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes considerar. Toda solicitud extemporánea se tendrá por no formulada.

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida su explotación económica y su uso político. No se permite su explotación económica ni su uso político. Queda prohibida su explotación económica ni su uso político.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COJIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LO-806004996-ES-2016



- IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
- V. Aquellas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;
- VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.

Las proposiciones de los licitantes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere esta fracción, serán desechadas por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila, debiendo comunicarlo anterior al Órgano Interno de Control en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra, preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.

Las personas que hayan realizado, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes y manifiesten por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajusten a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso consideraran costos estimados apropiados a las condiciones del mercado.

En el supuesto de que la manifestación bajo protesta a que se refiere el párrafo anterior se realice con falsedad se sancionará conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúes, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los exámenes en los que dichas personas o empresas sean partes.

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contrataciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interposición persona, con independencia de que quienes las recibían tengan o no relación con la contratación.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida su explotación económica y su uso político. No se permite su explotación económica ni su uso político. Queda prohibida su explotación económica ni su uso político.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LO-806004996-E8-2016

- XI.** Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, excepto cuando celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcelidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la obra que se pretende contratar.
- XII.** Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal de la Federación, salvo cuando celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcelidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la obra que se pretende contratar.
- XIII.** No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes a excepción de que no tengan obligación de hacerlo.
- XIV.** Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada, contando con el plazo de 15 (QUINCE) días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquel en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas.
- XV.** Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

No podrán participar en esta licitación pública nacional, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad de que por su conducta, no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los casos siguientes:

- a) Las personas morales en cuyo capital participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.
- b) Las personas morales que en su capital participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.
- c) Las personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. En este caso, la participación social deberá tomarse en cuenta.
- d) al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la falta de presentación del escrito con la manifestación bajo protesta antes indicada, será motivo para descalificar la proposición, por incumplir las disposiciones jurídicas que establecen el orden de esta materia.

Este documento es copia, según lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LO-806004996-E8-2016

Si de la información y documentación con que se cuenta, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 31 fracción XIV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En su caso, si el día en que se cumple el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo, no antecede el sancionamiento por haberse impuesto la inhabilitación subsidiaria hasta que se realice el pago de dicha multa.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El procedimiento de contratación por licitación pública nacional, se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento de contratación.

DE LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

La convocatoria al procedimiento de contratación se encuentra disponible para su consulta en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompuNet) y su obtención será gratuita, independientemente de encontrarse a disposición de los interesados, para su consulta, un ejemplar impreso de la convocatoria a la licitación en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, ubicada en Calle Reforma y J. Jesús Alcaraz s/n, colonia Centro de la cabecera municipal de Coquimatlán, Colima, en su caso, en el ejemplar impreso de la misma a las personas físicas y morales que deseen participar.

ESCRITOS CON LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE SOLICITAN EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU RECLAMAMIENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de participación en este procedimiento de contratación, solo resultarán procedentes si estos se encuentran previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para descalificarla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano verificará que los documentos a que se refieren el párrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de la información en ellos, para continuar con el procedimiento, sin perjuicio del derecho de Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para realizar dicha verificación en cualquier momento o cuando se pida en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o su Reglamento.

DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA.

Los licitantes, para los efectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de su Reglamento, entenderán por:

1. Secretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Este documento es copia, según lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



Coahuila

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COAHUILA.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Licitación pública nacional LO-80604996-EB-2016

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila podrá optar entre aplicar retenciones económicas, penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otra.

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila podrá, por aplicar retenciones económicas o penas convencionales, antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos.

El sobrecosto a que se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es la diferencia entre el importe que le representara a la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila preautonomamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila.

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de la Ley de la Ley de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, motivando la rescisión en alguna de las causales previstas en el artículo 157 de su Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente, en este caso, se estará a lo que resuelva la autoridad judicial.

Si la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila acepta por la rescisión administrativa del contrato, se aplicará lo establecido en los artículos 61 y 62, fracción II y último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su Reglamento.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.

El contratista se comprometerá a ejecutar la obra, de acuerdo con las normas de calidad y de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción que la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila proporcione y particulares de construcción, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a elección de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila sean realizados por terceras personas, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prorrateo para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila.

En razón de lo anterior, el contratista se obligará a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con lo indicado en las normas y especificaciones establecidas en el proyecto de obra, así como en especificaciones generales y particulares de construcción, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a elección de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila sean realizados por terceras personas, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prorrateo para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila.

Este documento es válido, salvo a cualquier punto en contrario. Ciudad de México, a los días 05 de mayo de 2016. *[Firma]*



Coahuila

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COAHUILA.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Licitación pública nacional LO-80604996-EB-2016

Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila, por lo que el contratista se obligará a devolver las cantidades que se originen por la reparación o reposición de los trabajos mal ejecutados, más los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquel en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.13 MARCO NORMATIVO

La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal Sobre Metodología y Normatización, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley Federal de Procedimientos Administrativos, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Fiscal de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2013, Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, la que se encuentra vigente en la fecha de la formalización del contrato, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2012, y demás normalidad y disposiciones administrativas de carácter federal aplicables.

6.14 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.13 denominado "MARCO NORMATIVO", de esta convocatoria a la licitación y en cualquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Los licitantes no podrán difundir o proporcionar información alguna relativa a los trabajos, en forma de publicidad o artículo (cuento a menos que cuenten con la autorización previa, expresa y por escrito de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, 1º Piso, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01030, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a través del Sistema de Información Pública Gubernamental (ComprobNet), en los términos de lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 274 a 283 de su Reglamento.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se tendrá por concluido el derecho para inconformarse.

Este documento es válido, salvo a cualquier punto en contrario. Ciudad de México, a los días 05 de mayo de 2016. *[Firma]*



COLOMBIA
Cocuyán

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATÁN, COLOMBIA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Definición pública nacional 10-806004996-63-2016

En el mismo, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán le aplica las penas convencionales que resultan de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos convocado, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos pactada en la cláusula sexta (6) de la que suscribe (1) del contrato, hasta la fecha de terminación total de los mismos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán.

El período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará lugar a la aplicación de penas convencionales.

Cuando las penas convencionales, estas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplica en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones económicas o de las penas convencionales que se apliquen, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS:

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán notificará al contratista señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará un igual período que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el nota circunstanciada de suspensión de los trabajos, la que deberá contener como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanentemente no será motivo de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos períodos sean reducidos y difusos de cuantificar, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán y el contratista podrán acordar que los períodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada de suspensión de los trabajos.

Esta suspensión es por el tiempo que se requiere para la ejecución de los trabajos. Cuando el contratista no cumpla con el tiempo que se requiere para la ejecución de los trabajos, el contratista será responsable de los costos de los trabajos.

1610191



COLOMBIA
Cocuyán

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATÁN, COLOMBIA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Definición pública nacional 10-806004996-63-2016

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se demoren o se destruyan y requieran ser retribuidos o reemplazados, éstos deberán pagarse mediante la retención de un convenio en los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspensión de los trabajos, solo procederá exclusivamente por los conceptos que señalan los 146 y 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán por caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando los trabajos no se hayan reutilizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las demás escrituras de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o reparación indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

6.10 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán y el contratista podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionará un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán emitirá al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitar a la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán, quien determinará la condonación dentro de las 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaración correspondiente, pero si la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que serán exclusivamente los indicados en el artículo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminación anticipada del contrato se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatán levantar un acta circunstanciada en la cual se hará constar como mínimo lo dispuesto por el artículo 151 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RESERVA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Esta reserva es por el tiempo que se requiere para la ejecución de los trabajos. Cuando el contratista no cumpla con el tiempo que se requiere para la ejecución de los trabajos, el contratista será responsable de los costos de los trabajos.



H. AYUNTAMIENTO DE COAHUILATLÁN, COAHUILA,
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LO-806009996-E8-2016

H. AYUNTAMIENTO DE COAHUILATLÁN, COAHUILA,
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LO-806009996-E8-2016

TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE COAHUILATLÁN LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, LA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE COAHUILATLÁN PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA, SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE COAHUILATLÁN, PODRÁN CONVENIRLO DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS, CON LAS MISMAS DE LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE HAYA SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DELA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE COAHUILATLÁN, Y EN LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS: ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO TEMPORAL DEL IMPORTE DE ESTA PÓLIZA DE FIANZA.

6.5. GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimación o estimaciones (excepto tratándose de retenciones económicas o penas convencionales, a que se refieren las cláusulas décima novena, vigésima y vigésima primera del modelo de contrato) o las que correspondan, por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuilatlán, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos imputarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente, de aquél en que se haya realizado el pago en exceso por parte de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuilatlán, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuilatlán.


No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resultan a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante se elaborado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento del contrato dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se estará a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado "FIRMA DEL CONTRATO".

6.7 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Esta inspección es pública, salvo a cualquier petición escrita. Queda prohibido el acceso para fines ajenos a los establecidos en el programa.



La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes, con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.8 RETENCIONES ECONÓMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONÓMICAS.

Las retenciones económicas se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuilatlán tendrá la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del contrato, se está ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado, para lo cual, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuilatlán comparará el avance mes a mes con el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuilatlán procederá a hacer las retenciones económicas a la estimación o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar al 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión. Las retenciones económicas serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y su aplicación al impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado al contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que la Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuilatlán reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión hubiera acumuladas.

Cuando las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones económicas a la fecha de terminación de la obra pactada en la cláusula sexta (6. la que corresponde) del contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuilatlán. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantificará a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado la Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuilatlán, y de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que las retenciones económicas efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones económicas se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula sexta (6. la que corresponde) del contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al



H. AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano



H. AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano



En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista deberá de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimbán la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de que se trate.

Quedarán a salvo los derechos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimbán, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio correspondan, una vez que se hayan efectuado las garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si el contratista opta por la política de fianza, deberá estar otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de materia, de la forma siguiente:

FORALTO DE POLÍTICA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA ELECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

FINANZA OTORGADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE COQUIMBATÁN A PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (Rubrica o denominación social de la persona natural o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato) CON DOMICILIO EN LA CANTIDAD DE \$ PESOS 000/100 M.N. SIN INCLUIR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INTERVENIDO OBRA RELATIVA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DE FECHA DE DE DE 201 CON IMPORTE TOTAL ENCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES (Inscripción completa del objeto del contrato, especificando en la cláusula anterior del mismo) CELBRADO CON EL MUNICIPIO DE COQUIMBATÁN LA PRESENTE FIANZA SE ENVIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO LA COMPARSIA AIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE AL LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD Y ES INDEPENDIENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO, SE APLIQUEN. AL LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCLUIDO EL CONTRATISTA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO. POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A LA AVANZADORA LA FIANZA QUE PARA CANCELADA CUANDO EL CONTRATISTA PRESENTE TRANSCRIBIDOS LOS 12 (DOCE) MESES Y EN CASO DE APARECER DEFECTOS EN LA OBRA VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA. ESTE MUNICIPIO DE COQUIMBATÁN EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b), SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Q- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CANCELADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ELECCIÓN DE LOS

Los trabajos se garantizarán por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir **COQUIMBATÁN** por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total generado de los trabajos, presentar un bien, aportar recursos líquidos, por una cantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total generado de los trabajos, o fideicomiso espesialmente constituido para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberán inscribirse en instrumento de traza fija.

El contrato, en su caso, podrá tener sus apropiaciones, en fideicomiso, y los respectivos rendimientos, transcritos los 12 (DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, para lo cual la Dirección de **Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimbán** instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria.

La igual plazo a que hace referencia el párrafo anterior, quedará automáticamente concedida la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el contrato.

Este documento es válido, según el siguiente código QR. Consulte el código QR para verificar la autenticidad de los datos contenidos en el documento.





H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Licitación pública nacional LO-806004996-68-2016

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su formalización, deberá solicitar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria, en los términos de lo dispuesto por la regla 11.2.1.13 y 4, que se refiere a la regla 11.2.1.15, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 y presentar al área convocante de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila el "actos de recepción" con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, el documento con la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere la fracción I de dicha regla, tendrá una vigencia durante un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión de la opinión correspondiente a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.

Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregaran al área convocante de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila, la que gestionará la emisión de la opinión ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana a su domicilio.

Cuando dos o más personas, físicas y/o morales, decidan agruparse para presentar una sola proposición en los términos a que se refiere el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y resulten adjudicatarias del contrato, cada una deberá presentar en lo individual, el "actos de recepción" o "actos de respuesta" emitido por el Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

No se requerirá el "actos de recepción" del Servicio de Administración Tributaria en el caso de que se lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.


En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el "actos de recepción" o "actos de respuesta" emitido por el Servicio de Administración Tributaria, sobre la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalización, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila se abstendrá de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y punto 8 del "OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales", número UNAOPSP/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de septiembre de 2008, y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública, la documentación de los hechos presuntamente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicatario.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes señalado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o adjudicación correspondiente, deberá solicitar la opinión al Sistema de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que la opinión se solicita para celebrar contrato de obra pública con la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila.

6.4. GARANTÍAS.

6.4.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le adjudicó el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor de la H. Ayuntamiento de Coahuila, según se establece en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Licitación pública nacional LO-806004996-68-2016

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados y con la obligación de hacerse efectiva por el monto total de la obligación garantizada en caso de la rescisión administrativa del contrato, aún cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado, de la forma siguiente:

FOBLZA DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA (Razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato), CON DOMICILIO EN LA CANTIDAD DE \$ PESOS 00/100 M. N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO DE FECHA DE DE 2011, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE \$ PESOS 00/100 M. N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificando en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE \$ PESOS 00/100 M. N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; C) EN EL CASO DE QUE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE COQUIMATLAN OTORQUE PROROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARÁ VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, Y SEA ENTREGADA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; D) LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE LOS MISMOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE COQUIMATLAN; E) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91, PRIMER PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; F) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMATLAN, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU

Este documento es público. Antes de cualquier acuerdo escrito, consulte el contenido de esta publicación en el sitio de Internet de la Secretaría de la Función Pública.



COQUIMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COQUIMA.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Licitación pública nacional L0-806004996-E8-2016

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocatoria, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocatoria, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si no fuere posible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo mutuo por insatisfacción que realice la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletines con el nombre de cada licitante empatedo, de la que se extraerá un primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletines de los licitantes que resultaron empatedos, con lo que se determinarán las subsecuentes ligures que ocuparán tales proposiciones.

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (SESENTA) días naturales contados a partir de la fecha en que se da a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna incertidumbre en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la incertidumbre e instancias subsecuentes; aledados dichos términos Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán podrá proceder a su devolución o destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6 DEL CONTRATO

6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato de obra pública, que se anexa a este oficio de solicitud de cotización de los trabajos, y en el que se establecen los derechos y obligaciones de las partes en la ejecución de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en la demás normativa aplicable vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, de ser el caso, el licitante ganador, de ser el caso, presentará para su copia, copia certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y el escrito en el que designe al superintendente de construcción, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento a los artículos 111 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

El licitante a quien se adjudique el contrato, previamente a la formalización del mismo, deberá firmar la totalidad de la documentación que surge de su proposición, así como una copia de la presente convocatoria a la licitación, en razón de formar parte integrante del contrato y designar como su representante ante la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán al superintendente de construcción que cuente con firma electrónica avanzada para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la ejecución de los trabajos.

Este procedimiento de licitación, se encuentra disponible en el sitio web de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán, en la siguiente dirección: <http://www.coquimatlan.gov.co>



COQUIMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COQUIMA.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Licitación pública nacional L0-806004996-E8-2016

de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: <http://www.coquimatlan.gov.co>.

La adjudicación del contrato obligará a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, primer párrafo y 48, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En la formalización del contrato se deberá recibir, en primer término, la firma del servidor público de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán que tenga las facultades necesarias para celebrar dichos actos y posteriormente se recibirá la firma del contratista. La fecha del contrato será aquella en la que el contratista lo hubiere firmado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Organismo Interno de Control y en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en su caso, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin necesidad de un nuevo procedimiento de licitación, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 68 de su Reglamento, y el punto 6.5 de esta convocatoria a la licitación, siempre que se diferencie un precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

Si la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán no firmare el contrato respectivo o cambio las condiciones de esta convocatoria a la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no será obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán, a solicitud escrita del licitante, cubrirá a sí las costas no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposición, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente procedimiento de contratación, conforme a lo previsto en el artículo 70, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.3 COMPROBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D, primero, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, los registros 2.1.15 y 1.2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2012, y el OFICIO Circular por el que se establecen el procedimiento que deberá observarse las dependencias y unidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas estén al corriente en sus obligaciones fiscales, amparo LINAOP/STF/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de septiembre de 2008, se observará lo siguiente:

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán exigirá del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se certifica opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.





H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación pública nacional LO-806004996-68-2016

- I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y
- II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o como ítem en su totalidad en la propuesta económica.

Asimismo, en razón de que las condiciones de pago será sobre la base de precios unitarios, se verificarán además, los siguientes aspectos:

- I. Del presupuesto de obra:
 - a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
 - b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de discrepancia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis; y
 - c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que así o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo revisar:

- a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
- b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
- c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado, y presentando el debido sustento de los precios;
- d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los salarios y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
- e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate; y
- f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:

- a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria a la licitación pública;
- b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos; y

Este programa es público, abierto a cualquier usuario público. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación pública nacional LO-806004996-68-2016

- c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinan los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:

- a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
- b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contrato; empujado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra; y
- c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a esta convocatoria a la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico;

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

- a) Que los ingresos por concepto del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago;
- b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
- c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;
- d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales;
- e) Que la meta para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establece en esta convocatoria a la licitación pública;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran; y

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38, quinto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 67, fracción I, de su Reglamento, el contrato se adjudicará a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria a la licitación, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila.

Este programa es público, abierto a cualquier usuario público. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



Coahuila de Zaragoza

H. AYUNTAMIENTO DE COAHUILTLAN, COAHILA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
Licitación Pública Nacional LO-806004996-EG-2016

Las proposiciones se evaluarán en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas solo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido, y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila tenga los elementos necesarios para determinar la suficiencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

Para la evaluación de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binario, a que se refiere el artículo 63, Fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 64, apartado A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la evaluación técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binario se verificarán, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada:

II. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerará, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos.

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante, demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general de ejecución de los trabajos considerado en su proposición.

VI. Se verificará en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y

c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en esta convocatoria a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, en razón de que las condiciones de pago serán sobre la base de precios unitarios, se verificarán además, los siguientes aspectos:

I. De los programas:

Este programa es obligatorio para el licitante, cuando se solicite el uso de los recursos a los establecimientos en el procedimiento.



Coahuila de Zaragoza

H. AYUNTAMIENTO DE COAHUILTLAN, COAHILA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
Licitación Pública Nacional LO-806004996-EG-2016

Los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización serán congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y resultados considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente; y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los períodos programados en los programas.

II. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de esta licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerados por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila emita un procedimiento, y

Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

III. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vía útil del material de que se trate; y

Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación pública; y

IV. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos; y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 65, apartado A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la evaluación económica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binario se verificarán, entre otros, los siguientes aspectos:

**OPERADO
PORTALECE**

Este programa es obligatorio, salvo a cualquier cargo público, cuando se solicite el uso de los recursos a los establecimientos en el procedimiento.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación pública nacional LG-806004996-ES-2016
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán dentro de los 5 (CINCO) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación del contratista y de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconstancia en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5.2 LICITACIÓN DESERTA.

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán, decidirá deserta la licitación cuando a su juicio la totalidad de las proposiciones presentadas, por los licitantes no reúnan los requisitos de esta convocatoria a la licitación o sus precios no fueran aceptables; cuando ninguna persona obtenga la convocatoria, o cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, señalándose en el fallo las causas que lo motivaron.

Se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán, y no sea factible pagarlos.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECIADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerará como causas suficientes para desear una proposición, cualquiera de los siguientes supuestos:

- I. La presentación incompleta, o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, que imposibiliten determinar su solvencia. (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);
- II. La presentación de información y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, incluyendo el convenio privado para la agrupación de personas físicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia. (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);
- III. Cuando en los documentos solicitados se consignan datos e informes distintos a los requeridos en esta convocatoria a la licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);
- IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán en esta convocatoria a la licitación pública y que afecten la solvencia de la proposición. (Artículo 69 fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);
- V. Cuando se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa. (Artículo 69 fracción III del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);
- VI. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Artículo 69 fracción IV del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Este programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación pública nacional LG-806004996-ES-2016

VII. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro o otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. (Artículos 31 fracción XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 fracción IV de su Reglamento);

VIII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Artículo 69 fracción V del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

IX. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos. (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

X. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios. (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XI. Cuando el licitante, en su documentación, no señale el indicador económico utilizado en el análisis del costo por financiamiento. (Artículo 65, apartado A, fracción V, letra c, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XII. Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso. (Artículos 50 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 65, apartado A, fracción V, letra a, y 185 fracción III, letra b, de su Reglamento);

XIII. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales o comerciales de la construcción. (Artículo 22B del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XIV. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico específico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios. (Artículo 197, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); y

XV. La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Artículo 69, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XVI. Omitir firmar autográficamente el catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos que deben ser firmados en cada una de sus hojas, conforme a lo indicado en el punto 4.14 de esta convocatoria a la licitación. (Artículo 41, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); y

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán, para hacer el estudio, análisis y evaluación de la solvencia de las proposiciones, se apegará a lo dispuesto en los artículos 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 63, fracción I, inciso b), 64, Apartado A, y 65, Apartado A, de su Reglamento;

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán, en caso de considerarlo conveniente, aunque no sea forzoso para ésta, podrá solicitar a los licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición, procediendo de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Este programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATAN, COLOMBIA.
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional ID-306820996-68-2016.



entrada a ningún licitante ni observador, o cualquier servidor público que no al acto y las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

Los licitantes, junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, deberán entregar copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Se procederá, en primer término, a dar apertura a las proposiciones de los licitantes que hayan presentado su proposición por escrito en el propio acto, posteriormente, las que fueron enviadas por servicio postal o de mensajería y, en segunda se cargaran en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompriNet) para lo cual el licitante, presentador, deberá entregar en un CD la documentación de su propuesta presentada, en formato PDF, de cada uno de los Anexos Económicos (AE 1 al AE 12) numerada del 2, 1, 4, 2, 3 y 4, 3, de esta convocatoria a la Licitación (con calidad media en escala de precios, no se admite señalar que aborran ser los mismos, que presenta en el sobre de su propuesta, folios y con firma autografiada), lo anterior a efecto de optimizar el proceso de carga electrónica de proposiciones en el Sistema CompriNet 1.5.0, durante el acto de presentación de proposiciones en atención del numeral 27 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompriNET, publicado en el Diario Oficial de la Federación El 28 de Junio de 2011, posteriormente se dará apertura e imprimirán los proposiciones enviadas por el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompriNet).

Se tendrá como no presentadas las proposiciones y, en su caso, la documentación requerida cuando el archivo electrónico en el que se cargaron las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener alguna virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan.

Cuando por causas ajenas al Sistema de Información Pública Gubernamental (CompriNet) o a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera inmediata y definitiva, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan fundará en el Sistema de Información Pública Gubernamental (CompriNet) la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

El formato de recepción de documentos servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en este acto, anexándose copia de la constancia entregada a cada licitante y firmada por el mismo.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionales con las Aisladas, la recepción de proposiciones se entenderá realizada una vez que estas se analizan durante su evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desahogada por incumplir la mencionada disposición legal.

De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan designado para presidir el acto, rubricará de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan el formato para prescribir el acta, rubricando de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan el formato para prescribir el acta, responsablemente al programa general de ejecución de los trabajos y al catálogo de conceptos, en el que se consignar los precios y el importe total de la obra objeto de esta licitación.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATAN, COLOMBIA.
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional ID-306820996-68-2016



Se levantará acta que contendrá como mínimo los requisitos que menciona el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionales con las Aisladas, que serviría de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar las proposiciones de los licitantes que las hayan presentado por escrito y, en su caso, las que fueron recibidas en tiempo y forma por medio del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompriNet), para su posterior evaluación integral y el importe total de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de algún licitante no restará valor al contenido del acta o efectos y al finalizar el acto se procederá a fijar un exemplar del acta en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano ubicadas en Calle Reforma #1 Jesús Alvaraz s/n, colonia Centro de la cabecera municipal Coquimatan, Col., por un término que no será menor a 5 (CINCO) días hábiles, debiéndose constar en el expediente de la licitación de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijado el acta.

En el acta se señalará que el fallo de la licitación se celebrará a las 15:00 horas, el día 29 de SEPTIEMBRE de 2016, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan, ubicadas en Calle Reforma y Jesús Alvaraz s/n, colonia Centro de la cabecera municipal de Coquimatan, Col.

La firma del contenido respectivo se llevará a cabo a las 11:00 horas, el día 30 de SEPTIEMBRE de 2016 en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan, ubicadas en Calle Reforma y Jesús Alvaraz s/n, colonia Centro de la cabecera municipal de Coquimatan, Col.

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan procederá con el análisis calificativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo señalado en el punto 5.4 de esta convocatoria, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo.

En junta pública, a la que podrán asistir libremente los licitantes que hubieren presentado proposiciones, se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual deberá contener los requisitos establecidos por el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionales con las Aisladas. El acta del fallo de la licitación comenzará con la lectura del resultado del mismo, levantándose el acta correspondiente, entregándose copia del acta en la que conste el fallo a los licitantes que hayan asistido al acto y se difundirá el contenido del fallo a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompriNet) el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a los licitantes.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará, por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompriNet), excepto en el caso de que algún licitante no haya proporcionado dirección de correo electrónico.

El fallo no podrá incluir información reservada o confidencial, en los términos que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan, dentro de los 5 (CINCO) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el C. ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS, titular de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatan del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de sus subordinados, actuando o rectificando al mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que la originaron y las razones que sustentan su emienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieren participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control en la

Esta proceesura es confidencial, dentro de cualquier sistema público. Cualquier revelación a una persona física, jurídica o cualquier servidor público en el procedimiento.

Esta proceesura es confidencial, dentro de cualquier sistema público. Cualquier revelación a una persona física, jurídica o cualquier servidor público en el procedimiento.



Coquimatlán

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
Licitación pública nacional LO-S06004996-E8-2016

- c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública.
- d. Descripción precisa y detallada (no porcentajes) de las partes-objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.
- e. Señalamiento de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, y
- f. Especificación expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta, solidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado por los artículos 36, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47, fracción II, inciso e) de su Reglamento, y lo estipulado en la cláusula primera del modelo de contrato de obra pública.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, incluyendo el convenio privado mencionado anteriormente, con el sobre que contenga la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán, se podrán considerar, en conjunto las correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes de la agrupación.

En caso de que el convenio privado de referencia no reúna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estará en la imposibilidad de evaluar la proposición para determinar la solución de la misma, y por lo tanto será desahuciada por no cumplir con los requisitos establecidos en esta convocatoria a licitación.

4.12 SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS.

No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de la obra. **(En este caso el licitante incluirá en su proposición el Anexo Técnico AT-5 que se le proporcione con la leyenda "NO APLICA")**

4.13 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE COQUIMATLÁN.


Para la ejecución de la obra, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán no proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente.

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.

El licitante o su representante legal deberá firmar autógrafamente la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de su proposición, salvo el catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos que deberán ser firmados en cada una de sus hojas, por lo que, el licitador no firmará el catálogo de conceptos y el citado programa en todas sus hojas, será tuativo para desechar la proposición.

En el caso de que estas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Sistema de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, tratándose de licitantes nacionales, y en el caso de extranjeros, los medios de identificación electrónica que otorgue o reconozca la Secretaría de la Función Pública, los cuales producirán los

Esta información es pública, salvo a estar expresamente prohibida. Toda reproducción sin el consentimiento expreso de la autoridad es prohibida.



Coquimatlán

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
Licitación pública nacional LO-S06004996-E8-2016

misma, efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN.

Los licitantes deberán integrar su proposición, en original y en la forma que previenen los puntos 4.2.2 y 4.2.3. Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnicas y económicas, así como los demás documentos que entregará el licitante.

Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado, claramente identificado en su parte exterior, con el número de la convocatoria a la licitación, objeto de la obra y el nombre o la razón social del licitante.

Los licitantes que opten por enviar sus proposiciones a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet), deberán integrar su proposición técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, identificando cada una de las paginas que integran su proposición, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de las propuestas.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

Para facilitar el procedimiento de contratación, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimatlán efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el artículo 74 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que forma parte de Compranet, así como a la documentación distinta a la proposición técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En ningún caso se impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes podrán presentar directamente sus propuestas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate.

En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACIÓN.

Las proposiciones por escrito deberán presentarse a las 08:00 horas, el día 27 de SEPTIEMBRE de 2016, en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, ubicadas en calle Reforma y J. Jesús Alcaraz s/n, colonia Centro de la cabecera municipal de Coquimatlán, Col., donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, bajo la presidencia del titular del área responsable de la contratación o por el servidor público que este designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Los licitantes o sus representantes legales, quienes previamente deberán registrar su asistencia, al ser nombrados entregarán sus proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito Documento Adicional DA 60 indicarán que su proposición fue enviada por el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet).

Cada licitante, sea persona física o moral, o agrupación de personas, sólo podrá presentar una proposición y serán los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que no se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a la licitación. Una vez iniciada el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá la

Esta información es pública, salvo a estar expresamente prohibida. Toda reproducción sin el consentimiento expreso de la autoridad es prohibida.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COAHUILA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Licitación pública nacional CO-306004996-E8-2016

El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila, dentro de los 3 (TRES) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efecto de los 30 (VEINTE) días en que deben ser pagadas las estimaciones una vez autorizadas por el residente de obra.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila mantendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Finalmente, se tendrán por autorizadas las estimaciones que la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila emita resolviendo respecto de su procedencia, dentro del término 15 (QUINCE) días naturales que para tal efecto dispone el primer párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la Bitácora la fecha en que se presentan a cobro las estimaciones.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el primer párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista.

El pago de los gastos de costos directos y del costo por financiamiento se elevará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado proporcionalmente a los factores que se autorizan para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste conceptuados deberán acumularse entre ellos.

La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá consistir por escrito, acompañando la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cada vez calculadas las importes de los gastos no recuperables, no se podrán aplicar a dichos importes los porcentajes por concepto de intereses, financiamiento y utilidad a que se refieren los artículos 212, 214 y 219 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4.9 PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN.

Ninguna de las condiciones contempladas en esta convocatoria a la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4.10 DESCUENTOS SOBRE IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

8

Esta programa es pública, según lo establece el artículo 34 de la Ley de Transparencia. Cuenta con acceso en línea para consultar los datos de esta licitación en el siguiente enlace:



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COAHUILA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Licitación pública nacional CO-306004996-E8-2016

En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre inscrito en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de conformidad con el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 26 de junio de 2007, entre la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el 0.002% (DOS MIL MILLARES) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila realizará el descuento en el porcentaje antes mencionado, conforme a la documentación 11.10 (la que corresponde) y la cámara mexicana deberá, inciso B) (de la que corresponde), del módulo de contrato, que será entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

Para la aplicación de este descuento, el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar escrito en el que haga constar su aceptación o negativa. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que en caso de repercutirlo, será motivo para desahar la proposición.

Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el 0.003% (TINCO MIL MILLARES) del importe de cada estimación, para cumplir con lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en Vigor, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 57, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

4.11 AGRIPLICACIONES DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES.

Dos o más personas, físicas y/o morales, podrán presentar conjuntamente su proposición, sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila, a parte de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, la forma en que serán presentados a cobro las estimaciones, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada autográficamente por el representante común que para ese año haya sido designado por el grupo de personas. En el caso de que la proposición sea enviada a través del Sistema de Información Pública Gubernamental (Comprovid), deberá utilizarse la firma electrónica avanzada que emite el Sistema de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tratándose de licitantes nacionales, y en el caso de extranjeros, los medios de identificación electrónica que otorga o reconoce la Secretaría de la Función Pública.

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables conjuntos, solidarios y mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Para la presentación conjunta, se deberá celebrar entre el grupo de personas un convenio privado, ratificado las firmas ante notario o fedatario público que cumpla, como mínimo, con los siguientes requisitos:

- a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
- b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de los escrituras públicas con las que acreditan las facultades de representación y deberá contar con facultades para otorgar poderes para formalizar el convenio para presentar proposición conjunta.

Esta programa es pública, según lo establece el artículo 34 de la Ley de Transparencia. Cuenta con acceso en línea para consultar los datos de esta licitación en el siguiente enlace:



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación Pública Nacional LO-806004996-E8-2015

Las proposiciones, así como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta convocatoria a la licitación, deberán presentarse en idioma español.

4.1 MONEDA EN LA QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

El tipo de moneda en la que se presentarán las proposiciones será en pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

4.5 ANTI-CIPOS.

Para la ejecución de la obra pública objeto del contrato, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, se otorgará el 30% de la asignación presupuestal aprobada al contrato, en el ejercicio de que se trate, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

El importe de los anticipos que se otorguen al Licitante será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria y en estas bases, al monto total de la proposición.

El pago del anticipo se realizará en una sola exhibición.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila, con fundamento en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción II del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.


Para efectos de la aplicación de ajuste de costos, se estará a lo señalado en el Capítulo Quinto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los 60 (SESENTA) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila la que lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción II del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual, invariablemente la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila deberá efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja. El contratista deberá acompañar a su solicitud la documentación indicada en los artículos 56, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 178 de su Reglamento.

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila, dentro de los 60 (SESENTA) días naturales siguientes a la fecha en que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila abrirá por escrito al contratista para que, en el plazo de 10 (DIEZ) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido este plazo sin que el contratista haya subsanado el error, se entenderá que el contratista acepta la resolución que se emita en su contra.

Este documento es público, según se manifiesta en el presente. Coahuila, a los 15 días del mes de mayo del 2015.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación Pública Nacional LO-806004996-E8-2015

dicho plazo, sin que el contratista quiera respuesta al apercebimiento, o no lo accediere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No dará lugar a ajuste de costos, las causas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeto. La imputación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El contratista recibirá de la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila, el pago total en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba cubrirse por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad y de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción que la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila proporcione.

4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, con la secuencia y tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, que abarcan un periodo no mayor a un mes calendario. Las que serán presentadas por el contratista a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite su pago tales como números, generadores, notas de bitácora, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías y análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a la estimación, según corresponda, de conformidad a las características, completitud y magnitud de los trabajos, conforme a lo que se establece en el artículo 132 del RLOPSRM, dentro de los 6 (SEIS) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que será el día 30 de cada mes; la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que serán pagadas a través de transferencia electrónica de fondos, en cuenta de cheques con el banco bancario autorizada en Institución Bancaria, dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura respectiva con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, para que la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila emita el trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

Los importes una vez analizados y validados deberán considerarse para su pago los derechos que, conforme al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Secretaría de la Función Pública, así como los impuestos correspondientes y se retendrán de la estimación o estimaciones que se otorgan al contratista.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa general de ejecución de los trabajos convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la Bitácora.

El retraso en el pago de estimaciones en que incurra, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila, dentro del plazo de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del convenio respectivo. No procederá dicho diferimento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista.

Este documento es público, según se manifiesta en el presente. Coahuila, a los 15 días del mes de mayo del 2015.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATAN, COQUIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación pública nacional/10-306004996-63-2016



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATAN, COQUIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación pública nacional/10-306004996-63-2016



AT 10 Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado de acuerdo a los períodos determinados por la dirección de obras públicas y desarrollo urbano de Coquimatán, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica y en su caso, con fechas críticas que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos.

AT 11 Programas calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los períodos determinados por la dirección de obras públicas y desarrollo urbano de Coquimatán, para los siguientes rubros:

- A Materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
- B Mano de obra.
- C Maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características, y
- D Utilización del personal profesional técnico administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

AE 1 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes, agrupado por:

- A Materiales más significativos y equipo de instalación permanente;
- B Mano de obra; y
- C Maquinaria y equipo de construcción.

AE 2 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, suscitado el trabajador de salarios base de mano de obra por jornada diaria de ocho horas e integración de los salarios:

- A Análisis del factor (p/r);
- B Tabla de cálculo del factor de salario real; y
- C Análisis, cálculo e integración del salario real.

AE 3 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

AE 4 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE 6 Unidad propuesta por el licitante.

AE 7 Cargos adicionales.

AE 8 Redacción y análisis de los costos básicos que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la función VII del artículo 44 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante.

AE 9 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluyan los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

AE 10 Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus cronogramas, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los períodos determinados por la dirección de obras públicas y desarrollo urbano de Coquimatán, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica y en su caso, con fechas críticas que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos.

AE 11 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los períodos determinados por la dirección de obras públicas y desarrollo urbano de Coquimatán, para los siguientes rubros:

- A materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos;
- B mano de obra.
- C maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características; y
- D utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

AE 12 Catálogo de conceptos, contenido descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición, sin incluir el impuesto al valor agregado

Este documento formará el presupuesto de la obra mínima que entrega esta dependencia, que servirá para finalizar el contrato correspondiente. Además anexar en este manual la CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION que está dirección entrega como parte de los anexos.

4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

03





H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación pública nacional LO-806004996-ES-2016.

- e) Que la proposición no se entregue en sobre cerrado;
- f) Cuando el sobre llegue roto por el mal manejo del servicio postal o de mensajería.

4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Las propuestas deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyan en esta convocatoria a la licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni emendas.

Las propuestas, que a elección de los licitantes sean enviadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), se sujetarán a lo siguiente:

Se tendrán como no presentadas las proposiciones y, en su caso, la documentación, requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila.

Cuando por causas ajenas al Sistema de Información Pública Gubernamental (CompraNet) o a la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coahuila informará en el Sistema de Información Pública Gubernamental (CompraNet) la fecha y hora en la que iniciará o reanudara el acto.

Las propuestas que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones o envíen a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), deberán estar integradas en la forma siguiente:

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE COQUIMATLAN, QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION.

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGHIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

AT 1 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio o sitios de realización de la obra y sus condiciones ambientales; de haber considerado los normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dirección de obras públicas de Coahuila les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcione la Dirección de Obras Públicas y desarrollo urbano de Coahuila; el programa de suministro correspondiente; Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

AT 2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo que establezca la dirección de obras públicas y desarrollo urbano de Coahuila.

AT 3 Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículo de cada uno de los profesionales técnicos que sean responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud análogas a las de la obra, antes a suscribir bandos públicos. *Cuando proceda, el caso, para obras de infraestructura en el desarrollo.*

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Licitación pública nacional LO-806004996-ES-2016.

similares, para efectos del último párrafo del artículo 30 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se considerará como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la ejecución de los trabajos realizados por personas de nacionalidad mexicana.

AT 4

Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratación, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades, éste lo manifestará por escrito a la dirección de obras públicas y desarrollo urbano de Coahuila, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 30 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

AT 5

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de la obra que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria a la licitación pública, la dirección de obras públicas y desarrollo urbano de Coahuila, deberá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán. Tratándose de agrupación de personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

AT 6

A) Los documentos que acrediten la capacidad financiera, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN DONDE SE EMITA OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

AT 7

Reducción de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispusiera de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

AT 8

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se colizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la secretaría de economía, en materia de prácticas desleales de comercio internacional.

AT 9

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición, agrupado por:

- A. Materiales más significativos y equipo de instalación permanente;
- B. Mano de obra;
- C. Maquinaria y equipo de construcción.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COQUIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LD-808004996-ES-2016



2 INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

En esta convocatoria a la licitación se especifican la obra que se licita, el procedimiento para esta licitación y las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos:

- a. Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposición, con formatos de escritos (Documentos adicionales DA 1 a DA 13).
- b. Anexos técnicos/Anexos Técnicos AT 1 a AT 11) y económicos/Anexos Económicos AE 1 a AE 12), con formatos de escritos y guías de llenado.
- c. Modelos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y de pólizas de fianzas.
- d. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, aplicables.
- e. Catálogo de conceptos y carta compromiso de la proposición, y

Los licitantes deberán examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y económicos, y sus guías de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyan en esta convocatoria a la licitación para que no incurran en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposición.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones o envíen a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), deberán anexar la siguiente información:

Archivo Electrónico en formato de Word ó Excel de los documentos ATT Y AE 1 AL AE 12

3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatlán podrá modificar el contenido de esta convocatoria a la licitación, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en las (s) juntas (s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de aclaraciones a la convocatoria a la licitación que formulan los licitantes, serán de observancia obligatoria para los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

Cualquier modificación de la convocatoria a la licitación derivada del resultado de las (s) juntas (s) de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria a la licitación.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se harán del conocimiento de los licitantes exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se generen.

4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

Los licitantes deberán entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la entrega en un sólo sobre, claramente identificando en su parte exterior con la clave de la convocatoria a licitación.



Este programa es confidencial, según lo establece el artículo primero, inciso b) de la Ley 1712 de 2014, por la cual se crean las entidades y se establece el sistema de información.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COQUIMA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LD-808004996-ES-2016



Las proposiciones deberán ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrán desecharse cuando las últimas hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos, mismos que deberán ser firmados en cada una de sus hojas.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a esta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integran. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entreguen los licitantes.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constatare que no los folios no foliados mantengan continuidad, la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatlán no podrá desechar la proposición.

En el caso de que las proposiciones sean enviadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), en sustitución de la firma autógrafa, deberán emplear la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la cual producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sí lo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatlán, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmeza manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representante, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (Documento Adicional DA 6).

Los licitantes a su elección y bajo su exclusiva responsabilidad podrán enviar su proposición en sobre cerrado a través del servicio postal o de mensajería, debiéndose consignar en la dirección indicada en el primer párrafo del numeral 5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta por enviar su proposición por cualquiera de estos medios, la entrega deberá ser previa al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones.

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano de Coquimatlán abstendrá de recibir toda proposición que se envíe por servicio postal o de mensajería que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) Que se entregue después del plazo para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones;
- b) Que se entregue en una dirección distinta a la indicada en esta convocatoria a la licitación;

14/11



Coquimbatán

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMBATÁN, COLIMA.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Licitación pública nacional LO-806004996-E8-2016

lo que son objeto de las medidas de control y seguimiento establecidas en el mecanismo presupuestario específico, y en las disposiciones legales aplicables.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS.

La obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitación, consistirá en

"PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR."

En la comunidad de Coquimbatán, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción que la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano proporciona.

1.3 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de la obra será el día 03 de OCTUBRE de 2016 y la fecha de terminación será el día 31 de DICIEMBRE de 2016.

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El plazo de ejecución de la obra será de 90 días naturales, contados a partir de la fecha de iniciación de la misma.

1.5 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.3y con el plazo solicitado en el punto 1.4.

Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimbatán.

El programa deberá ser reproducible, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en los puntos 4.2.2 y 4.2.3.

1.6 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitación, podrán visitar el sitio o sitios en los que se realizará la obra, siendo oportiva para los interesados, para que, considerado las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieren, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.

En ningún caso, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimbatán asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de la obra no le releva de su obligación para ejecutarla y concluir en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de la obra y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación, ya sean derivadas de la Junta de aclaraciones, de preguntas adicionales que se formularon, o de cualquier otro acto que se haya realizado.

Esta programación es pública, abierta a cualquier servicio público. Queda reservado el uso para fines administrativos y las modificaciones en el presupuesto.



Coquimbatán

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMBATÁN, COLIMA.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Licitación pública nacional LO-806004996-E8-2016

hayan efectuado con posterioridad a la Junta de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable (Anexo Técnico AT 1), por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al formato por este motivo.

1.7 LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA.

El lugar de reunión para la visita al sitio de la obra será en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, calle Reforma y Jesús Alcazar s/n, colonia Centro de la cabecera municipal de Coquimbatán, Col., a las 11:00 horas, el día 20 de SEPTIEMBRE de 2016, siendo atendidos por el **ING. JORGE ALEJANDRO MACÍAS**

1.8 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La Junta de aclaraciones se llevará a cabo con posterioridad a la visita al sitio de realización de la obra. La primera Junta de aclaraciones se celebrará en la sala de cabildo de la presidencia municipal calle Reforma y Jesús Alcazar s/n, colonia Centro de la cabecera municipal de Coquimbatán, Col., a las 12:00 horas, el día 20 de SEPTIEMBRE de 2016, siendo optativa la asistencia a las reuniones por parte de los interesados en participar en este procedimiento de contratación.

El acto será presidido por el servidor público designado, quien será asistido por un representante del área referente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria o la licitación. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimbatán.

En los(s) junta(s) de aclaraciones, el servidor público que la presida el acto procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración referentes a cada numeral o punto de la convocatoria o la licitación mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante y en la que deberán constar las preguntas de los licitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitación para la elaboración y presentación de las proposiciones, indicando si en la última o habrán una posterior y que será firmada por los licitantes y los servidores públicos que intervengan, entregándose copia de la misma a los licitantes que asistieren y para los ausentes, se pondrá a su disposición en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet). De proceder modificaciones a la convocatoria a la licitación, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera Junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de Compranet, no serán contestadas por el servidor público que presida la Junta de aclaraciones por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que preside la Junta de aclaraciones considerara necesario citar a una posterior Junta, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimbatán tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coquimbatán, atendidas en presidencia municipal en calle Reforma y Jesús Alcazar s/n, colonia Centro de la cabecera municipal de Coquimbatán, Col. por un término que no será menor a 5 (CINCO) días hábiles, dejándose constancia en el expediente de la licitación de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

Esta programación es pública, abierta a cualquier servicio público. Queda reservado el uso para fines administrativos y las modificaciones en el presupuesto.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COAHUILA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Licitación pública nacional LO-806004996-03-2016
 Así mismo integrar copia legible de Acta constitutiva, COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA y en el caso de las personas morales de la persona que firme la proposición y copia de su cédula de identificación Fiscal (o *Forma de Registro Federal de Contribuyentes*)

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 5.

Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiestan bajo protesta de decir verdad que por sí mismos, o a través de interposto persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que oborquen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 6.

En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos recibidos de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideram costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 7.

Escrito en el que el licitante acepta expresamente que se tendrá como no presentada su proposición y, en su caso, la documentación requerida en esta licitación, cuando el archivo electrónico en el que se entregó la proposición y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila. Dicho escrito deberá presentarse al área convocante en forma previa al acto de presentación y apertura de proposiciones.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 8.

INFORMACIÓN ELECTRÓNICA CONTENIENDO LOS REQUISITOS Y LA PROPIEDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA.

En las propuestas que se entreguen en forma impresa en el acto de presentación y apertura de proposiciones, incluir archivo electrónico conteniendo los Documentos Económicos (Anexos AE 1 AL AE 12), numerales 4.2.2 y 4.2.3 de esta convocatoria, ESCANEADOS EN FORMA DE PDF y firmados todos idénticamente como la propuesta presentada (la que se entrega impresa en sobre cerrado) con utilidad media en tonos de grises *RGB: 128, 128, 128* *CMYK: 100, 100, 100* anterior a efecto de optimizar el proceso de carga electrónica de proposiciones en el Sistema ComprasNET 5.0, durante el acto de presentación de proposiciones; atendido lo señalado en el numeral 27 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado ComprasNET, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011

Ejemplo de forma recomendada para crear el nombre de cada Archivo. Ejemplo:

Nombre de la Empresa: Construcciones *Ejemplo*, S. de C.V.
 Inicial(es) del nombre de la empresa: CE
 Licitación en *Ejemplo* Participa: *CE-2016*

33

Nombre del Archivo: AE2.CE.NX

Este programa es gratuito, según lo establece el artículo 125 de la Ley de Acceso a la Información Pública, G.O. 2012

Este programa es gratuito, según lo establece el artículo 125 de la Ley de Acceso a la Información Pública, G.O. 2012



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COAHUILA.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Licitación pública nacional LO-806004996-03-2016
 Anexo Económico AE 12.6..... Nombre del Archivo: AE12.CE.NX

DOCUMENTO DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Para la ejecución de la obra, no se requerirá la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de fabricación o contenido nacional.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACRREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.

Los licitantes deberán acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecución de obras de la misma naturaleza, con la identificación de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares. Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se considerará como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la ejecución de las trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana. (Documento Técnico AT 3)

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecución de obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sean comprobable su participación, atendido el número de la contratación, descripción de las obras, importes totales, importes ejecutados o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado, en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades, este lo manifiesta por escrito a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Coahuila, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalado, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Documento Técnico AT 4)


Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de propuestas. (Documento Técnico AT 6)

En el caso de los interesados que desistan de participar, para cumplir con la capacidad financiera requerida se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes de la agrupación, tomando en consideración a la obligación es conjunta, solidaria y/o mancomunada.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de esta licitación, las fuentes de financiamiento serán por tanto General 23 en lo correspondiente al FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2016) para aplicarse a la obra, haciendo constar que los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, no pierden ese carácter al ser fideicomitadas, por





H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COAHUILA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LO-306004/996-ES-2016

Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Monto total ofrecido: el importe correspondiente al costo total otorgado con cargo al presupuesto autorizado para el contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Normas de entidad: los requisitos mínimos que establecer las dependencias y entidades, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados.

Obras: las señaladas en el artículo 3 de la Ley.

Obras de gran complejidad: aquellas cuya ejecución o el sitio donde se vayan a realizar presenten dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como las que señala el primer párrafo del artículo 6 de este Reglamento, y en las cuales se considerará que el avance del desarrollo de los estudios y proyectos: estará constituido por una propuesta conceptual.

Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere la fracción II del artículo 161 de este Reglamento, que oferte el fabricante o proveedor en el momento en que se formaliza el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor.

Presupuesto autorizado: el que la Secretaría comunica a la dependencia o entidad en el cuantitativo de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia o entidad determina para ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios.

Proyecto de convocatoria: el documento que contiene la versión preliminar de una convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en CompraNet por la dependencia o entidad.

Servicios: los mencionados en el artículo 4 de la Ley.

Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.

Superintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

REQUISITOS.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CON LAS PROPOSICIONES.
 Con fundamento en lo que establecen los artículos 28 y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las personas físicas y morales que deseen participar en este procedimiento de contratación, deberán presentar sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado el que se acompañará con la documentación adicional, y a su elección, a través de medios remotos de comunicación electrónica, de conformidad con el numeral 10 del "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2011, sin que el envío de sus proposiciones, a través de medios de comunicación electrónica limite su participación en los diferentes actos derivados de la presente licitación.

Los licitantes, deberán acompañar fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

Los licitantes que presenten su proposición por escrito, deberán acompañar fuera o dentro del sobre que contenga su proposición, y los que las envíen por medio del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental "CompraNet", en un solo sobre cerrado, en cualquier formato electrónico. Cuando éste acompañe al sobre para fines de otorgar el contrato, deberá estar en un solo sobre cerrado.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COAHUILA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Licitación pública nacional LO-306004/996-ES-2016

(CompraNet), los siguientes documentos:

DOCUMENTO ADICIONAL DA 1: Requisitos de quien asiste al acto de presentación y apertura de propuestas en lugar del representante legal.

- a. Carta poder simple.
- b. Identificación oficial de quien asiste al concurso.

DOCUMENTO ADICIONAL DA 2:

Original del escrito en el que señale domicilio y una dirección de correo electrónico, en caso de contar con ella, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en su caso, del contrato de obra pública, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

DOCUMENTO ADICIONAL DA 3:

Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que por su conducta no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 51 de la propia Ley.

La falsedad en la manifestación a que se refiere este documento adicional será sancionada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que cuenta la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretendan evadir los efectos de la inhabilitación, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 51, fracción IV, y 78, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DOCUMENTO ADICIONAL DA 4:

Original del escrito mediante el cual los licitantes o sus representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá los datos siguientes:

- a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

- b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.



Este procedimiento de licitación, abierto a cualquier persona física o moral, se encuentra disponible en el sistema CompraNet, en el sitio: www.compranet.gob.mx



Coahuila de Zaragoza



Coahuila de Zaragoza

H. AYUNTAMIENTO DE COAHUILATLAN, COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Letificación pública nacional/LD-866009996-68-2016

II. **Comprender:** el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sureños; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las modificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollan procedimientos de contratación.

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la indelebilidad y conservación de la información que contenga.

III. **Dependencias:** las señaladas a continuación:

- Las unidades administrativas de la Presidencia de la República.
- Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y
- La Procuraduría General de la República.

IV. **Entidades:** las mencionadas en las fracciones IV, V y VI del artículo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Los organismos descentralizados; Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fiduciarios en los que el fiduciante sea el Gobierno Federal o una entidad parastatal; y

Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

V. **Tratados:** los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asuman compromisos;

VI. **Contratista:** la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;

VII. **Licitante:** la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas;

VIII. **Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura:** las obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulicos, medio ambiente, turismo, educación, salud y energético;

IX. **Proyecto ejecutivo:** el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;

X. **Proyecto arquitectónico:** el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresa por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros;

XI. **Proyecto de ingeniería:** el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad;

XII. **Entidades federativas:** los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Este documento es confidencial, según lo establece el artículo 149 de la Ley de Acceso a la Información Pública Federal

83

SI/4 OPERADO FORTALECE

H. AYUNTAMIENTO DE COAHUILATLAN, COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Letificación pública nacional/LG-866009996-68-2016

XIII. **Amortización programada:** la contraprestación periódica que la dependencia o entidad tiene obligación de cubrir al inversionista contratista por la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operación;

XIV. **Área responsable de la contratación:** la facultada en la dependencia o entidad para realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas;

XV. **Área responsable de la ejecución de los trabajos:** la facultada en la dependencia o entidad para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;

XVI. **Área requeriente:** la que en la dependencia o entidad solicita o requiere formalmente la contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquella que los utilizará;

XVII. **Área técnica:** la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones;

XVIII. **Avance financiero:** el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual;

XIX. **Avance físico:** el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación a los trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido;

XX. **Bitácora:** el instrumento, físico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora convencional;

XXI. **Caso forzado o fuerza mayor:** el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas;

XXII. **Comité:** el comité de obras públicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley;

XXIII. **Especificaciones generales de construcción:** el conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidos para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo;

XXIV. **Especificaciones particulares de construcción:** el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción;

XXV. **Estándar de desempeño:** el conjunto de parámetros de desempeño y calidad que deben satisfacerse en el diseño, la ejecución, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operación de obras públicas;

XXVI. **Estimación:** la valoración de los trabajos ejecutados en un período determinado presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la autorización de los anticipo; los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones, así como, la valoración de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables;

XXVII. **Inversión contratista:** la persona que celebre contratos de obras públicas, asociadas a proyectos de infraestructura en los términos del Capítulo Segundo de este Reglamento;

XXVIII. **Investigación de mercado:** la verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional e internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en la información que se obtenga en términos del presente Reglamento;

Este documento es confidencial, según lo establece el artículo 149 de la Ley de Acceso a la Información Pública Federal



III.5 ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA (ART. 37 LOPSRM)



000195

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcáraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social."

H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LO-806004996-E8-2016 Licitación pública nacional
ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES



EN LA CIUDAD DE **COQUIMATLAN, COLIMA** SIENDO LAS **08:00 HORAS**, DEL DÍA **27 DE SEPTIEMBRE DE 2016** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SUS ARTÍCULOS 36 Y 37, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 59, 60 Y 61 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA **DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** UBICADAS EN CALLE. **REFORMA ESQUINA CALLE J. JESÚS ALCARÁZ S/N, COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, COL.**, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, EL FONDO PARA ESTE PROCEDIMIENTO PERTENECE AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2016).

PRESIDEN EL ACTO EL **ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS CON CARGO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO** ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA **DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**, ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA Y RECIBIR EL SOBRE CERRADO QUE CONTIENE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PRESENTAN LOS LICITANTES, REFERENTE A LA **Licitación pública nacional LO-806004996-E8-2016**, RELATIVA A, "**PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR.**"; A CONTINUACIÓN, SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS PROPOSICIONES, ASÍ COMO LA REVISION DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS MISMAS, PROCEDIENDO A LA REVISIÓN CUANTITATIVA A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN LA CONVOCATORIA A ESTA LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES, SIN EVALUAR SU CONTENIDO.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO PREVISTO EN LA BASE SEGUNDA FRACCIÓN I, SÉPTIMO PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA A ESTA LICITACIÓN, LOS LICITANTES QUE ASISTEN AL ACTO Y CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO, Y LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RUBRIQUEN LOS DOCUMENTOS: **E-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA Y E-11 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, E12 CATALOGO DE CONCEPTOS**, ESTOS DOCUMENTOS QUE SE RUBRIQUEN SERÁN LOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE ACTA DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION EN LA BASE DE REFERENCIA.

OPERADO FORTALECE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COQUIMATLAN, COL. 2015-2016 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LO ANTERIOR, A EFECTO DE DEJAR CONSTANCIA DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR PARTE DE LOS LICITANTES SOBRE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A ESTA INVITACION REESTRINGIDA, ASÍ COMO DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS DE FORMA CUANTITATIVA EN ESTE ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE. POR LO QUE SE ELABORA LA RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR CADA LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN

"2016, Años de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo."

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

11

11



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LO-806004996-E8-2016 Licitación pública nacional
ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES



SE ACEPTAN LAS PROPOSICIONES PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO A FIN DE DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y OPERATIVAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:



No.	EMPRESA	IMPORTE + IVA
01	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV	\$ 2'124,852.29
02	CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO SA DE CV	\$ 2'172,767.43
03	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLIMA SA DE CV	\$ 3'043,752.06
04	JAIME MORFIN ROBLES	\$ 2'270,183.59
05	THICSA SCC SA DE CV	\$ 2'198,784.62
06	COSNTRUCTORA CONTINENTAL DEL PASIFICO SA DE CV	\$ 2'277,541.53
07	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$ 2'551,782.16
08	CONSTRUCCIONES MILES DEL PASIFICO S DE CV	\$ 2'201,691.33
09	CUBER COSNTRUCCIONES SA DE CV	\$ 2'217,802.75

A EFECTO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO ESTÉ EN CONDICIONES DE ANALIZAR EL CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, SE CITA A LOS PARTICIPANTES A LAS 15:00 HORAS, DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FECHA MARCADA PARA EMITIR EL FALLO.

PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMAS OFICINAS EN DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN, EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN RUBRICAN Y FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA MISMA Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS POR VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRANET, ASÍ MISMO SE FIJARA UN EJEMPLAR DE ESTA ACTA, PARA CONSULTA DE LOS INTERESADOS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE. REFORMA ESQUINA CALLE J. JESÚS ALCARÁZ S/N, COLONIA CENTRO DE AL CABECERA MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, COL., EL ACTA ESTARÁ VISIBLE DEL DÍA 29 SEPTIEMBRE AL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"



000197

"2016, Años de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo."

))

))



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 LO-806004996-E8-2016 Licitación pública nacional
 ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES



POR LA CONVOCANTE Y DEPENDENCIAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 COQUIMATLAN, COL.
 2015-2018
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 PÚBLICAS MUNICIPALES

**OPERADO
 FORTALECE**

<p>DIRECCION GENERAL DE PLANEACION</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. FERNANDO RAMIREZ FUENTES</p>	<p>SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.</p> <p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>LUIS M. COBIAN CASTILLO</p>
<p>POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ARQ. LIZETTE MURILLO AVALOS</p>	<p>POR LA CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COL.</p> <p>Prof. Sergio Hernandez Torres</p>
<p>TESTIGO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CARLOS PARTIDA VERA</p>	<p>OPERADOR PLATAFORMA COMPRANET</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA</p>

COQUIMATLAN, COL.
 2015-2018
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 COQUIMATLAN, COL.
 2015-2018
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LOS LICITANTES

<p><i>CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. CESAR HERNADEZ</p>	<p><i>CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO SA DE CV</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>GUILLERMO TINOCO GOMEZ</p>
<p><i>CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLIMA SA DE CV</i></p>	<p>JAIME MOREIN ROBLES</p> <p><i>[Signature]</i></p>

000193

"2016, Años de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo."

[Handwritten signatures and initials]

1000







1000

1000




H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 LO-806004996-E8-2016 Licitación pública nacional
 ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES



 <hr/> MANUEL RIVERA SERNA	<hr/> JAIME MORFIN ROBLES 
THICSA SCC SA DE CV  <hr/> JAIME HEREDIA GARCIA	CONSTRUCTORA CONTINENTAL DEL PASIFICO SA DE CV  <hr/> ADOLFO VICENCIO RIOS
GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV  <hr/> ANGEL MARIO COLLASO TORRES CUBER COSNTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCCIONES MILES DEL PASIFICO S DE CV  <hr/> MARIA DOLORES URZUA MAGAÑA
 <hr/> YOSELINE MONZERRAT VIDRIO C.	

OPERADO FORTALECE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"







000199

"2016, Años de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo."





H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 LO-806004996-E8-2016 Licitación pública nacional



OPERADO FORTALECE

APERTURA DE PAQUETES

Coquimatlán, Col., a 27 de septiembre de 2016

Siendo las 08:00 horas del día 27 de SEPTIEMBRE de 2016 se reunieron en la Dirección de Obras Públicas Municipales con domicilio en Reforma y J. Jesús Alcaraz S/N de este municipio para la entrega de las propuestas:

“PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR. ”

Con número de PROCEDIMIENTO LO-806004996-E8-2016 Licitación pública nacional los licitantes interesados en participar en este proceso de contratación.

Firman al calce los representantes de las empresas.

Empresa	Representante legal	Firma
ALMA GUADALUPE DENIZ BENITEZ		
ARCO CUB S DE RL DE CV		
CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV	<i>Inglés Hernández</i>	<i>[Signature]</i>
CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO SA DE CV	GUILLEMO TINOCO GOMEZ	<i>[Signature]</i>
CONSTRUCCIONES MARAL FD SA DE CV		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA SA DE CV	Ximena Anais Velles Velasco	[Signature]
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA SA DE CV		
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLIMA SA DE CV	Manuel Rivera Serna	Manuel R.
CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA SA DE CV		
CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS GENEVAL SA DE CV		
FRANCISCO JOSE CASTILLO BARRAGAN		
HECTOR GODINA RODRIGUEZ		
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES OCCICOL SA DE CV		
J JESUS AMEZCUA ESPINOZA		
JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA		
JAIME MORFIN ROBLES	Ximena Anais Velles Velasco	<i>[Signature]</i>
JOSE ROBERTO ROCHA CASTILLO		
JOSE TLACAELEL NEGRETE MICHEL		
MARIANO ALBERTO MICHEL LOPEZ		
METROVIA DESARROLLOS SA DE CV		
MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN		
MIGUEL RAMIREZ GALINDO		
PROYECTOS VIABLES Y CONSTRUCCION SA DE CV		
RALAD SA DE CV		
THICSA SCC SA DE CV	JAIIME HEREDIA GARCIA	<i>[Signature]</i>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social”



000200

Constructora Continental del Pacifico, SA de CV.
 Grupo Prestador de Servicios Industriales S.A. de C.V.
 Adolfo Villavicencio Rosal
 Adolfo Villa P.
 Angel Mario Collaso Torres
 Angel Mario

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.

* Construcciones Miltes del Pacifico, S.A. de C.V.
Maia Dolores Uzúa Magaña ~~Uzúa~~

* CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Yoceline Morizerral Vidrio Carrero ~~Morizerral~~

Contraloría del Estado

Arq. Lizette Muñillo Avalos ~~Muñillo~~

Arq. Nestor Ivon Ramirez Mendez ~~Ramirez~~

~~Ramirez~~

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

OPERADO
FORTALECE



III.7 DICTAMEN TÉCNICO PARA EMISIÓN DEL FALLO (ART. 38 LOPSRM)



000205

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016
DICTAMEN ANALITICO DE LAS PROPUESTAS



EN LA CIUDAD DE **COQUIMATLAN, COLIMA** SIENDO LAS **15:00 HORAS**, DEL **DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016** SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DEL PRESENTE DICTAMEN, EN LAS OFICINAS DE LA **DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** UBICADAS EN CALLE. **REFORMA ESQUINA CALLE J. JESÚS ALCARÁZ S/N, COLONIA CENTRO DE AL CABECERA MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, COL.** PARA CELEBRAR EL ACTO DE **"DICTAMEN ANALITICO DE LAS PROPUESTAS"** CORRESPONDIENTES A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. **LO-806004996-E8-2016**, RELATIVA A, **"PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR."** EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS** CON CARGO DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** DEL **H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COL.** EN REPRESENTACIÓN DEL **C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS**, PRESIDENTE MUNICIPAL DE **COQUIMATLAN, COL.**

UNA VEZ RECIBIDOS LOS SOBRES DE LOS PARTICIPANTES QUE CONTENÍAN SUS PROPOSICIONES TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICAS SE PROCEDIO A ABRIR Y ANALIZAR LA DOCUMENTACION QUE CONTENÍAN LAS PROPUESTAS, OBTENIÉNDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No.	EMPRESA	ESTATUS DOCUMENTACION	OBSERVACIONES
01	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV	COMPLETA	NINGUNA
02	CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO SA DE CV	COMPLETA	Ae-3 el Precio incorrecto del combustible no él precio de lista ah esta fecha gasolina 12.40 siendo 12.05 más IVA.
03	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLIMA SA DE CV JAIME MORFIN ROBLES	COMPLETA	EXCEDE EL TECHO FINANCIERO.
04	OPERADO FORTALECE	COMPLETA	Ae-3 el Precio incorrecto del combustible no él precio de lista ah esta fecha diésel cotizado en 12.00 siendo 12.45 más IVA. Ae-2propuesta solo considera en su análisis de factor de salario real 5 días por ley siendo 7 días este año.
05	THICSA SCC SA DE CV	COMPLETA	Ae-3 el Precio incorrecto del combustible no él precio de lista ah esta fecha diésel cotizado en 8.62 siendo 12.45 más IVA. Ae-2propuesta solo considera en su análisis de factor de salario real 5 días por ley siendo 7 días este año.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

"2016, Año de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo"

000206



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016
DICTAMEN ANALITICO DE LAS PROPUESTAS



06	COSNTRUCTORA CONTINENTAL DEL PASIFICO SA DE CV	COMPLETA	NINGUNA
07	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	COMPLETA	NINGUNA
08	CONSTRUCCIONES MILES DEL PASIFICO S DE CV	COMPLETA	NINGUNA
09	CUBER CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMPLETA	Ae-3 el Precio incorrecto del combustible no el precio de lista ah esta fecha diésel cotizado en 10.29 siendo 12.45 más IVA, gasolina 9.98 siendo 12.05 más IVA. Ae-2 propuesta solo considera en su análisis de factor de salario real 2 días por ley.

CON BASE AL ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LAS "PROPUESTAS TÉCNICAS, LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COL., PROCEDIO AL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

OPERADO FORTALECE

POSTOR	IMPORTE + IVA	ANALISIS
CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV	\$ 2`124,852.29	POR HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EN TIEMPO Y FORMA, DEL CONTRATO RESPECTIVO Y SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA.

CON TODO LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTÓ EN EL ARTÍCULO 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ASIMISMO, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL ANALISIS Y LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COL., DETERMINA SE ADJUDIQUE EL CONTRATO A LA EMPRESA CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV CON UN IMPORTE DE: \$ 2`124,852.29 (Dos millones ciento veinticuatro mil ochocientos cincuenta y dos PESOS 29/100 M.N) MAS I.V.A., QUIEN REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ES LA PROPUESTA ECONOMICA MAS CONVENIENTE Y MAS BAJA.

000207

"2016, Año de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo."





H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016
DICTAMEN ANALITICO DE LAS PROPUESTAS



PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN RUBRICAN Y FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA MISMA Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS POR VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRANET, ASÍ MISMO SE FIJARA UN EJEMPLAR DE ESTA ACTA, PARA CONSULTA DE LOS INTERESADOS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE. REFORMA ESQUINA CALLE J. JESÚS ALCARÁZ S/N, COLONIA CENTRO DE AL CABECERA MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, COL., EL ACTA ESTARÁ VISIBLE DEL DÍA 30 SEPTIEMBRE AL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

POR LA CONVOCANTE Y DEPENDENCIAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COQUIMATLAN, COL.
2015-2018
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

**OPERADO
FORTALECE**

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION ING. FERNANDO RAMIREZ FUENTES POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. LUIS M. COBIAN CASTILLO POR LA CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COL.
ING. JOSE ELIAS BARBOSA MARIA TESTIGO	Prof. Sergio Hernández Torres OPERADOR PLATAFORMA COMPRANET
LIC. CARLOS PARTIDA VERA	ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

000203


"2016, Año de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo."



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016
DICTAMEN ANALITICO DE LAS PROPUESTAS



POR LOS LICITANTES

<p><i>CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>ING. CESAR HERNANDEZ</i></p>	<p><i>CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>GUILLERMO TINOCO GOMEZ</i></p>
<p><i>CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLIMA SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>MANUEL RIVERA SERNA</i></p>	<p><i>JAIME MORFIN ROBLES</i></p>  <hr/> <p><i>JAIME MORFIN ROBLES</i></p>
<p><i>THICSA SCC SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>JAIME HEREDIA GARCIA</i></p>	<p><i>CONSTRUCTORA CONTINENTAL DEL PASIFICO SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>ADOLFO VICENCIO RIOS</i></p>
<p><i>GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>ANGEL MARIO COLLASO TORRES</i></p>	<p><i>CONSTRUCCIONES MILES DEL PASIFICO S DE CV</i></p> <hr/> <p><i>MARIA DOLORES URZUA MAGAÑA</i></p>
<p><i>CUBER COSNTRUCCIONES SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>YOSELINE MONZERRAT VIDRIO C.</i></p>	

OPERADO FORTALECE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

000209



"2016, Año de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo"



III.8 ACTA DE FALLO DE CONCURSO (ART. 39 LOPSRM)



000210

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaráz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016
ACTA DE FALLO



ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO EN QUE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COL., DA A CONOCER SU RESOLUCIÓN RELATIVA AL CONCURSO POR EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS: "PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR." (ESTE FONDO PERTENECE AL FONDO FORTALECE 2016)

**OPERADO
FORTALECE**

EN EL MUNICIPIO DE **COQUIMATLAN, COL.,** A LAS **15:00 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016** SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, EN LAS OFICINAS DE LA **DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** UBICADAS EN CALLE. **REFORMA ESQUINA CALLE J. JESÚS ALCARÁZ S/N, COLONIA CENTRO DE AL CABECERA MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, COL.,** PARA CONOCER LA RESOLUCIÓN TOMADA CORRESPONDIENTE AL CONCURSO CITADO.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS** CON CARGO DE **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COL.** EN REPRESENTACIÓN DEL **C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS,** PRESIDENTE MUNICIPAL DE **COQUIMATLAN, COL.,** PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016,** EL CUAL SE FUNDAMENTÓ EN EL ARTÍCULO 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ASI MISMO, COMUNICÓ QUE DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y DE HABER LEIDO EL DICTAMEN ANALITICO DE LAS PROPUESTAS (ANEXO DE ESTA ACTA), LA **DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO A **CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV** CON UN IMPORTE DE: **\$ 2`124,852.29 (Dos millones ciento veinticuatro mil ochocientos cincuenta y dos PESOS 29/100 M.N) MAS I.V.A.,** QUIEN REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ES LA PROPUESTA ECONOMICA MAS CONVENIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE SIN I.V.A.
"PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR."	\$ 2`124,852.29

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER FIRMADO EL DÍA **03 DE OCTUBRE DEL 2016,** A LAS **10:30 HRS** PRESENTANDO PARA EL EFECTO COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DONDE SE ACREDITE LA PERSONALIDAD DE QUIEN FIRMARÁ, DICHO ACTO SE CELEBRARÁ EN LAS OFICINAS DE **LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** UBICADAS EN CALLE. **REFORMA ESQUINA CALLE J. JESÚS ALCARÁZ S/N, COLONIA CENTRO DE AL CABECERA MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, COL.,**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN, COL. DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
000211

2016 Año de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo."



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016
ACTA DE FALLO



ASIMISMO DEBERÁ ENTREGAR LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ANTICIPO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN RUBRICAN Y FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SIENDO LAS 15:30 HRS, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA MISMA Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS POR VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRANET, ASÍ MISMO SE FIJARA UN EJEMPLAR DE ESTA ACTA, PARA CONSULTA DE LOS INTERESADOS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE REFORMA ESQUINA CALLE J. JESÚS ALCARÁZ S/N, COLONIA CENTRO DE AL CABECERA MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, COL., EL ACTA ESTARÁ VISIBLE DEL DÍA 30 SEPTIEMBRE AL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

POR LA CONVOCANTE Y DEPENDENCIAS

**OPERADO
FORTALECE**

<p align="center">DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</p> <p align="center"><i>(Firma)</i></p> <p align="center">ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS</p> <p align="center"><small>CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN, COL. 2015-2018 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES</small></p>	<p align="center">DIRECCION GENERAL DE PLANEACION</p> <p align="center"><i>(Firma)</i></p> <p align="center">ING. FERNANDO RAMIREZ FUENTES</p>
<p align="center">POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p align="center"><i>(Firma)</i></p> <p align="center">ING. JOSE ELIAS BARBOSA MARIA</p>	<p align="center">POR LA CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COL.</p> <p align="center">Prof. Sergio Hernández Torres</p>
<p align="center">TESTIGO</p> <p align="center"><i>(Firma)</i></p> <p align="center">LIC. CARLOS PARTIDA VERA</p>	<p align="center">OPERADOR PLATAFORMA COMPRANET</p> <p align="center"><i>(Firma)</i></p> <p align="center">ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA</p>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

000212

"2016, Año de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo."




H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COLIMA.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016
ACTA DE FALLO




POR LOS LICITANTES

<p><i>CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>ING. CESAR HERNADEZ</i></p>	<p><i>CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>GUILLERMO TINOCO GOMEZ</i></p>
<p><i>CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLIMA SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>MANUEL RIVERA SERNA</i></p>	<p><i>JAIME MORFIN ROBLES</i></p>  <hr/> <p><i>JAIME MORFIN ROBLES</i></p>
<p><i>THICSA SCC SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>JAIME HEREDIA GARCIA</i></p>	<p><i>CONSTRUCTORA CONTINENTAL DEL PASIFICO SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>ADOLFO VICENCIO RIOS</i></p>
<p><i>GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>ANGEL MARIO COLLASO TORRES</i></p>	<p><i>CONSTRUCCIONES MILES DEL PASIFICO S DE CV</i></p> <hr/> <p><i>MARIA DOLORES URZUA MAGAÑA</i></p>
<p><i>CUBER COSNTRUCCIONES SA DE CV</i></p> <hr/> <p><i>YOSELINE MONZERRAT VIDRIO C.</i></p>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>OPERADO FORTALECE</p> </div>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"





"2016, Año de la Inclusión e igualdad para las personas con Autismo."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA



CONTRATISTA:		CONTRATO A:	
CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		PRECIO ALZADO ()	PRECIOS UNITARIOS (X)
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:		No. DE CONTRATO:	FECHA DE ADJUDICACION:
CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO- 021/2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES		No. DE OBRA O PROYECTO	FECHA DE CONTRATACION:
CTA010202QM2		021/2016	03 DE OCTUBRE DE 2016
DOMICILIO		PROCEDIMIENTO:	FECHA DEL FALLO:
AV. NIÑOS HEROES 630-A, COLONIA CENTRO, COLIMA C.P. 28400		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS:

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, ADOQUINADO HEXAGONAL ASENTADO EN ARENA, REPARACIÓN DE BANQUETAS Y SUMINISTRO DE TUBO PARA COLECTOR PLUVIAL.

ORIGEN DE LOS RECURSOS		NÚMERO DE CUENTA								
PROGRAMA: FORTALECE 2016		15719792								
DATOS EN CASO DE CREDITO:		AÑO	ENT.	PROG.	SPROG.	PROY.	U	PART.	U	DV
		2016	06							

No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO:

"PEF 2016" Recursos asignados mediante CONVENIO de adhesión al contrato, monto de recursos registrado al último día hábil del mes de Marzo de 2016 Y ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 24 de Mayo de 2016.

FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:
03 DE OCTUBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2016

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO	30% ANTICIPO		IMP. PARA	
		TOTAL	I.V.A. INCLUIDO	INICIO (10%)	PERMANENTE (20%)
				I.V.A. INCLUIDO	I.V.A. INCLUIDO
J21/2016 PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR	\$ 2.464.828,66	\$ 739.448,60	\$ 246.482,87	\$ 492.965,73	\$ 492.965,73
	\$ 2.464.828,66	\$ 739.448,60	\$ 246.482,87	\$ 492.965,73	\$ 492.965,73

ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	
AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.		AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.	
No. DE FIANZA: 3720-10530-7		No. DE FIANZA: 3720-10529-9	
IMPORTE:	\$ 739.448,60	IMPORTE:	\$ 246.482,87

FIRMAS DE CONFORMIDAD

 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLAN LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS	 REPRESENTANTE LEGAL C. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
---	--

OPERADO FORTALECE

000403

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016**



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo de Coquimatlan"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN, REPRESENTADO POR EL LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ, QUIÉN ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, SEGÚN CONSTA EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", EL CUAL CONSIGNA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLUSULAS:



DECLARACIONES:

PRIMERA: "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

A.1.- ESTAR INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA MANEJAR SU PATRIMONIO CON ARREGLO A LA LEY, SEGÚN LO DISPONE LA FRACCION II DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 87 FRACCION I, II, IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA Y LOS ARTICULOS 2 Y 3 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA.

A.2.- EL LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, COLIMA, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA NUMERO 109 DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015, TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO BASÁNDOSE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 47 FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA.

A.3.- DEBIDO A QUE LA BITACORA DE OBRA ES UN INSTRUMENTO DE CARÁCTER JURIDICO, IDEADO PARA ESTABLECER UN ORDEN Y UN EQUILIBRIO ENTRE QUIEN ORDENA Y QUIEN PAGA LA OBRA, Y QUIEN LA EJECUTA A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION ECONOMICA, ESE DOCUMENTO PASA A SER UN ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO; ES POR ELLO QUE LOS REPRESENTANTES DE "EL AYUNTAMIENTO" AUTORIZAN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA QUE SEAN EL VINCULO LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO CON EL DESARROLLO DE TODO EL PROCESO DE LA BITACORA.

B.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE EJERCERAN FONDOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL PROGRAMA "PEF 2016" Recursos asignados mediante CONVENIO de adhesión al contrato, monto de recursos registrado al último día hábil del mes de Marzo de 2016 Y ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 24 de Mayo de 2016.

C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN REFORMA Y JESUS ALCARAZ S/N. DE ESTE MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO; DE IGUAL FORMA, PARA LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, SE IDENTIFICA FISCALMENTE CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. R.F.C. MCC-850101-LUA.

D.- QUE "EL AYUNTAMIENTO" ACLARA QUE DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS, LA LEY APLICABLE A ESTE CONTRATO Y A LA QUE QUEDA SUJETO ES LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENOMINADA EN LO SU SECESIVO "LA LEY".

E.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-806004996-E8-2016. CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA.

F.- QUE "EL AYUNTAMIENTO" ADJUDICA EL PRESENTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA" EN VIRTUD DE QUE ÉSTE PRESENTÓ LA MEJOR PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA LICITADA, SEGÚN SE DESPRENDE DEL ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y TIENE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA NECESARIA Y ADEMAS DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

000404

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el Social"



B.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO AV. NIÑOS HEROES 630-A, COLONIA CENTRO, COLIMA C.P. 28400, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C.- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN "LA LEY", ASI COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN "EL AYUNTAMIENTO" Y EN SU CASO DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES NORMATIVAS CORRESPONDIENTES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA, EL PROYECTO Y EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS CON LAS CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE EJECUCION, TODOS ELLOS COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEHRANTE DE ESTE CONTRATO.

D.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR EL DESARROLLO Y ENTREGA OPORTUNA DE LA OBRA.

E.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE "LA LEY"

OPERADO FORTALECE

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" UNA OBRA CONSISTENTE EN: "021/2016 PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR.", DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS SEÑALADAS EN EL INCISO "E" DE LA DECLARACION PRIMERA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: \$ 2,464,828.66 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS 66/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA: OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS.- "EL AYUNTAMIENTO" NO OTORGARÁ ANTICIPO PARA ESTA OBRA, YA QUE EL CONTRATISTA HA MANIFESTADO QUE NO LO REQUIERE PARA INICIAR LOS TRABAJOS Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBRA ENCOMENDADA. DADO LO ANTERIOR, NO SE REALIZARÁ AMORTIZACIÓN ALGUNA EN LAS ESTIMACIONES.

SEXTA: PROGRAMA Y BITÁCORA.- LA OBRA DEBERÁ DESARROLLARSE DE ACUERDO CON EL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE OBRA, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

"EL AYUNTAMIENTO" DARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LAS ÓRDENES QUE ESTIME PERTINENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y ÉSTE QUEDA OBLIGADO A ACUSAR RECIBO DE LAS MISMAS Y A PROCEDER A SU CUMPLIMIENTO.

LAS ÓRDENES SE DARÁN A TRAVÉS DEL LIBRO Y/O VIA ELECTRONICA BITÁCORA DE LA OBRA O MEDIANTE OFICIO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A FIRMAR DE ENTERADO LAS NOTAS ASENTADAS EN LA BITÁCORA Y

000405

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

RESPONDER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. SI "EL CONTRATISTA" NO FIRMA DE ENTERADO EN LA NOTA O NO LA RESPONDE EN UN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES, SE TENDRÁ POR ACEPTADO LO ASENTADO EN LA NOTA. EL LIBRO DE BITÁCORA, CON HOJAS FOLIADAS Y CON COPIAS PARA "EL CONTRATISTA" ESTARÁ PERMANENTEMENTE Y DURANTE LAS HORAS DE TRABAJO EN EL LOCAL DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, PARA CONSULTA Y ASIENTOS DE NOTAS POR "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO RECIBA EL ANTICIPO EN LOS TIEMPOS ACORDADOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL AYUNTAMIENTO" LOS TIEMPOS DE EJECUCION PROGRAMADOS SE DEFINIRÁN EN LOS MISMOS TIEMPOS QUE SE DESFASE LA ENTREGA DEL ANTICIPO. EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ADJUDICACION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA.

OPERADO POR
FORTALECE

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA OTORGAR ANTICIPO PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE "LA LEY", SIN QUE PUEDA EXCEDERSE EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

PARA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION POR LA CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CATALOGO DE CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA; "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO".

SEPTIMA: ESPECIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA" EJECUTARÁ LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES DE "EL AYUNTAMIENTO", A LAS DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL TIPO DE OBRA, ESPECIFICACIONES ESPECIALES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y AL PROYECTO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

OCTAVA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.- "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA OBRA, Y SERÁ LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA QUE LA OBRA RESULTE DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, CALIDAD, PLAZO Y TODO AQUELLO CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE ESTA CLÁUSULA, LA SUPERVISIÓN TENDRÁ A SU CARGO.

- I.- LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA;
- II.- VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTEN A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO A LO QUE ESTIPULA EL MARCO NORMATIVO, ASÍ COMO A LO ORDENADO POR "EL AYUNTAMIENTO";
- III.- REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS EN COORDINACIÓN CON "LA CONTRATISTA", APROBARLAS Y FIRMARLAS, DANDO TRÁMITE ANTE "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU PAGO;
- IV.- MANTENER LOS PLANOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS;
- V.- INTEGRAR UN ALBUM FOTOGRÁFICO COMPLETO DE LA OBRA;
- VI.- CONSTATAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS;
- VII.- ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DE LAS OBRAS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DEL MARCO NORMATIVO;
- VIII.- ELABORAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN;
- IX.- RENDIR INFORMES CON PERIODICIDAD SEMANAL Y UNO GENERAL AL FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE "LA CONTRATISTA" EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES RELACIONADOS CON EL CONTRATO, Y;

000406

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo de la actividad"

Coquimatlán
A Autorización 2016-001

X.- LAS DEMÁS QUE "EL AYUNTAMIENTO" CONSIDERE CONVENIENTES.

ES FACULTAD DE "EL AYUNTAMIENTO" REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O FABRICACIÓN, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PERMITIR EL ACCESO AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DESIGNADO POR "EL AYUNTAMIENTO" A LOS MENCIONADOS LUGARES.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE QUIEN DEBERÁ ESTAR REGISTRADO ANTE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS Y CORRESPONSALES O SIMILAR DEL AYUNTAMIENTO Y, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON SUFICIENTE EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ÍNDOLE DE LAS QUE AQUÍ SE CONTRATAN Y QUE DEBERÁ SER PREVIAMENTE ACEPTADO POR "EL AYUNTAMIENTO", ACEPTACIÓN QUE ESTA PODRÁ REVOCAR A SU JUICIO.

OPERADO
FORTALECE

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER AMPLIAMENTE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN "EL AYUNTAMIENTO", LAS DE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CASO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO LEGALMENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR EN NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE AL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LE FUERE IMPOSIBLE A ÉSTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYA SU SOLICITUD. "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERÁ SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO "EL CONTRATISTA", O LA QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

EN LA MISMA FORMA SE PROCEDERÁ EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA OBRA SUFRA DEMORA POR NO HABERSE PODIDO REGULARIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR EL DERECHO DE VÍA O EL APROVECHAMIENTO DE LOS BANCOS DE MATERIALES SEÑALADOS POR "EL AYUNTAMIENTO".

SI SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS QUE FUERAN IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE PODRÁ SOLICITAR TAMBIÉN UNA PRÓRROGA, PERO SERÁ OPTATIVA PARA "EL AYUNTAMIENTO" EL CONCEDERLA O NEGARLA. EN CASO DE CONCEDERLA, "EL AYUNTAMIENTO" DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER A "EL CONTRATISTA" LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE NEGARLA, PODRÁ EXIGIR A "EL CONTRATISTA" EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ORDENÁNDOLE QUE ADOpte LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA OPORTUNAMENTE O BIEN PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA.

DECIMA: MODIFICACIONES Y VARIACIONES AL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIA EL OBJETO DEL PROYECTO, SE CELEBRARÁN CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS ADICIONALES DEBERÁN SER AUTORIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE "EL AYUNTAMIENTO". DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VERIFICACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

000401

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



OPERADO FORTALECE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

Coquimatlán
14 de Septiembre 2016

"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A PRESENTAR UN CATÁLOGO ACTUALIZADO DE CONCEPTOS, CADA VEZ QUE EN LA OBRA RESULTEN VOLÚMENES EXCEDENTES, CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO O EXISTAN MODIFICACIONES AL PROYECTO O ESPECIFICACIONES QUE INCIDAN EN EL MISMO, ELLO EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR "EL AYUNTAMIENTO".

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EJECUTAR LAS OBRAS POR EL MONTO REDUCIDO A LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO CONFORME AL NUEVO CALENDARIO QUE SE ESTABLEZCA. EN ESTE CASO Y CUANDO LO ESTIME NECESARIO "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICANDO EL PROGRAMA, LO QUE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ACEPTAR.

DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARQUEN EL PERIODO DE UN MES MAXIMO, ACOMPAÑADAS POR GENERADORES FIRMADOS POR "EL CONTRATISTA" Y VALIDADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ANEXANDO LA FACTURA CORRESPONDIENTE, REPORTES FOTOGRAFICOS Y DEMAS DOCUMENTACION REQUERIDA, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, QUE PODRAN SER SEMANALES, QUINCENALES O MENSUALES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA DIRECCION DE PLANEACION INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA LA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI Y, POR LO TANTO CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. POR LO QUE DEBERAN EFECTUARSE POR "EL AYUNTAMIENTO", BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR DE A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN CON CARGO A "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR EL PAGO DE LO INDEBIDO.

DÉCIMA SEGUNDA: TRABAJOS ORDINARIOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL CATÁLOGO, EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARÁN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. DICHS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN A LAS OBRAS, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SON RÍGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL CATÁLOGO, EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA "EL AYUNTAMIENTO" MEDIANTE LA SUPERVISIÓN ORDENARÁ A "EL CONTRATISTA" SU

000403

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



**OPERADO
FORTALECE**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

**CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016**



EJECUCIÓN Y ÉSTE SE COMPROMETE A LLEVARLOS A CABO, PRESENTANDO A REVISIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO" LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA SOLICITADA POR "EL AYUNTAMIENTO".

LAS TARJETAS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DEBERÁN DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS.

- a) DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA DEL CONCEPTO QUE SE VA A EJECUTAR, MISMA QUE DETERMINARÁ LA SUPERVISIÓN MEDIANTE LA NOTA DE BITÁCORA;
- b) UNIDAD DE CONCEPTO (M2, KG., PZA.) EVITANDO UNIDADES DE MEDIDAS DE TIPO GENERAL, TALES COMO LOTE O SIMILARES;
- c) VOLUMEN APROXIMADO A EJECUTAR;
- d) EXPRESAR EN LO POSIBLE LAS MARCAS Y MODELOS, DE LOS INSUMOS QUE LOS INTEGREN; Y,
- e) FIRMAS AUTÓGRAFAS DE "EL CONTRATISTA", DEL SUPERVISOR ADSCRITO A LA OBRA QUE ORDENÓ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEL DIRECTOR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A LAS MISMAS DEBERÁN DE INTEGRARSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- a) NOTA DE BITÁCORA EN DONDE SE CONSIGNE LA INSTRUCCIÓN POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LA CUAL TAMBIÉN SE INDICARÁ EL MOTIVO POR EL CUAL SE ORDENA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO EXTRAORDINARIO (NO SE CONTEMPLA EN CATÁLOGO, CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN, MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ETC.);
- b) PLANOS, CROQUIS O FOTOGRAFÍAS EXPLICATIVAS, SOBRE TODO, EN LOS CONCEPTOS ATÍPICOS;
- c) FACTURA O EN SU CASO PRESUPUESTOS, CUANDO EL CONCEPTO TRATE DE SUMINISTROS DE INSUMOS NO CONTENIDOS EN LAS BASES DE CONCURSO; Y,
- d) TARJETAS DE BÁSICOS CUANDO ESTAS NO SE INCLUYAN EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREVIAMENTE A LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS Y SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

I. SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEA APLICABLE A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, "EL AYUNTAMIENTO" ESTARÁ FACULTADA PARA ORDENAR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZAR CONFORME A DICHS PRECIOS.

II. SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y "EL AYUNTAMIENTO" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS CON LA INTERVENCIÓN DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR CONFORME A TALES PRECIOS.

III. SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS INCISOS ANTERIORES, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARÁ LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN LOS TABULADORES QUE TENGA EN VIGOR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO O EN SU DEFECTO, PARA CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS TOMARÁ EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR LOS PRECIOS DEL TABULADOR. EN UNO U OTRO CASO, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A LOS NUEVOS PRECIOS.

IV. SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS INCISOS I, II, III "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SEÑALE, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA INTELIGENCIA QUE PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS DEBERÁ APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERA SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHS PRECIOS UNITARIOS, LOS QUE JUNTO CON SUS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES QUEDARÁN INCORPORADOS A ESTE CONTRATO, PARA TODOS SUS EFECTOS.

"EL AYUNTAMIENTO" DETERMINARÁ UNILATERALMENTE LOS PRECIOS UNITARIOS, CUANDO, AL TRANSCURRIR EL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENA SU

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

EJECUCIÓN, "EL CONTRATISTA" NO HAYA PRESENTADO LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS PARA SU REVISIÓN, O SI HABIÉNDOLAS PRESENTADO NO SE PRESENTA PARA CON SU INTERVENCIÓN DETERMINAR LOS PRECIOS, EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN ESTA CLÁUSULA.

SI "EL AYUNTAMIENTO" NO OPTA POR NINGUNA DE LAS SOLUCIONES SEÑALADAS EN LOS INCISOS DE ESTA CLÁUSULA, PODRÁ ENCOMENDAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A TERCERAS PERSONAS.

DECIMA CUARTA: GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO CONSIDERANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", MISMA QUE SERÁ PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" RECIBIÓ COPIA DEL ACTA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, GARANTIZARÁ LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE "LA LEY", PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

DECIMA QUINTA: AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DEL COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO A LO ACORDADO POR LAS PARTES EN LA PRESENTE CLÁUSULA. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS, QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE; AJUSTÁNDONOS AL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DE "LA LEY".

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

I.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES;

II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS POR "EL CONTRATISTA" CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LA METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL REFERIDO BANCO;

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"



III.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y

IV.- A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

LA AUTORIZACIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS, EN MONEDA NACIONAL, DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, EN CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL NO PODRÁ SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA EXTRANJERA SE SUJETARÁ A LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN VI DE "LA LEY" Y 153 A DEL REGLAMENTO.

LOS ÍNDICES BASE QUE SERVIRÁN PARA EL CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO, SERÁN LOS QUE CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, DEBERÁN SER LOS QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO PODRÁN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR NINGUNA VARIACIÓN QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN Y EL ÚLTIMO DÍA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTÓ.

PARA LOS EFECTOS DEL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 DE "LA LEY", Y CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRÁ SOLICITAR, POR UNA SOLA OCASIÓN, LA DETERMINACIÓN DE UN PRIMER FACTOR DE AJUSTE, EL CUAL DEBERÁ CALCULARSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN ESTE CONTRATO. ESTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN NO DEBERÁ AFECTARSE POR LA ENTREGA DE ANTICIPOS. ESTO NO APLICARÁ EN LAS OBRAS O SERVICIOS QUE INICIEN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PREVIA JUSTIFICACIÓN, AUTORIZARÁN DICHO FACTOR, EL QUE SERÁ APLICADO A CADA ESTIMACIÓN Y REPERCUTIRÁ DURANTE TODO EL EJERCICIO DEL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE LE SUCEDAN.

SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS SE OTORGA ALGÚN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERÁN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

A.- LA RELACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O, EN SU CASO, LOS ÍNDICES INVESTIGADOS POR "EL AYUNTAMIENTO" Y SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA;

B.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO, DETERMINADO A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO;

C.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO, DETERMINADO A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO

000411

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo municipal"



SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 58 DE "LA LEY", MISMO QUE SE INDICA EN LA FRACCIÓN III DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN ESTA CLÁUSULA.

D.- EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO, A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS;

E.- EL ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE, Y

F.- LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS AJUSTES DE COSTOS, SE DEBERÁN PRECISAR LAS CANTIDADES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS, SE PODRÁ DETERMINAR UTILIZANDO LAS MATRICES DE CÁLCULO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DEL CONTRATO, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, EN LOS QUE SE SUSTITUYAN LOS COSTOS BÁSICOS DE CADA INSUMO DEL COSTOS DIRECTO, ACTUALIZADOS CON LOS ÍNDICES APLICABLES DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA BAJA, SERÁ "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN LO REALICE EN IGUAL PLAZO. CUANDO "EL CONTRATISTA" PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD RESPECTIVA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN TÉRMINOS DE ESTA CLÁUSULA, MISMA QUE SE FUNDAMENTA EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 148 Y 152 DEL REGLAMENTO. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DEL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERÍODO DE QUE SE TRATE; PARA ESTOS CASOS SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

"EL AYUNTAMIENTO" O ENTIDAD DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS.

TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE.

DECIMA SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDO "EL CONTRATISTA" COMUNIQUE A "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE SU DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILIS, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE OBRA EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALEN.

A).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO, SEA IDENTIFICABLE Y SUSCEPTIBLE DE UTILIZARSE Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO". EN ESTE CASO SE LIQUIDARÁ A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"



B).- CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO, SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

C).- CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. EN ESTE CASO LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

D).- CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, EN ESTE CASO, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.- EN ESTE CASO, SE SUJETARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 60 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION DE DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, TODO ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DE "LA LEY".

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO EL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE TENDRÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE "EL AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS.

DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES. ASÍ COMO A RECONOCER A SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA DE INSTRUCCIONES, VIOLACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, UTILIZACIÓN DE MATERIALES DEFECTUOSOS, APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INCORRECTOS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCERAS PERSONAS.

LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA". CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA POR "EL AYUNTAMIENTO", ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN

INMEDIATA, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA". SI NO ATENDIERA LOS REQUERIMIENTOS DE "EL AYUNTAMIENTO", ÉSTA PODRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LO QUE SE TRATE, CON CARGO A "EL CONTRATISTA", Y EN SU CASO, SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS OTORGADA.

000/13

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"



"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A PRESENTAR A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA MISMA INCLUYENDO LAS INSTALACIONES. ESTA ACTUALIZACIÓN DEBERÁ LLEVARSE CONFORME AL TRANCURSO DE LA A OBRA Y BAJO LA SUPERVISIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO" QUIEN FIRMARÁ POR APROBACIÓN EN LOS MENCIONADOS PLANOS. ASIMISMO DEBERÁ ENTREGAR EL ARCHIVO DIGITALIZADO DEL TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LA OBRA (OFICIOS, ESTIMACIONES, FOTOGRAFÍAS, ETC.)

DECIMA OCTAVA: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA NOVENA: RELACIONES LABORALES.- " EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIALES DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO DE RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGESIMA: SUBCONTRATACIÓN: "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA DE "EL AYUNTAMIENTO", PERO PODRÁ SUBCONTRATAR PARTE DE LA OBRA SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL SUBCONTRATISTA SE SUBROGUE NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO, AÚN EN EL CASO DE SUBCONTRATAR "EL CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE "EL AYUNTAMIENTO" POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

PARA QUE "EL CONTRATISTA" PUEDA SUBCONTRATAR PARTE DE LA OBRA SERÁ NECESARIO QUE SATISFAGA LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- a) SOLICITAR POR ESCRITO LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE "EL AYUNTAMIENTO" EXPONRIENDO LOS MOTIVOS QUE TIENE PARA PEDIR LA SUBCONTRATACIÓN;
- b) "EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ SU AUTORIZACIÓN CUANDO A SU JUICIO EL SUBCONTRATISTA TENGA LA MISMA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y MORAL DE "EL CONTRATISTA"; Y,
- c) QUE EXISTA INSCRIPCIÓN PREVIA DEL SUBCONTRATISTA EN EL DIRECTORIO DE CONTRATISTAS Y PROYECTISTAS DE "EL AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA PRIMERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- SE APLICARÁN PENAS CONVENCIONALES POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENO" OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

LAS PENAS SERÁN DE 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y SE APLICARÁN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS, EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES ÚNICAMENTE PROCEDERÁN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA"; LA DETERMINACIÓN DEL ATRASO SE REALIZARÁ CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONVENIDO. NO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EL PERIODO EN EL CUAL SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

000414

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



OPERADO FORTALECE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

Coquimatlán
14 de Agosto 2016

LAS PENAS SE ESTABLECEN ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR, TIPO DE CONTRATO, GRADOS DE AVANCE Y POSIBILIDAD DE ESTABLECER FECHAS DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MEDIANTE RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA, SALVO

QUE EN EL CONTRATO SE HAYA PACTADO QUE DICHAS PENAS NO SERÁN DEVUELTAS EN CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS PACTADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

LAS RETENCIONES ECONÓMICAS TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, ÉSTOS NO HAN SIDO CONCLUIDOS.

DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE "EL AYUNTAMIENTO" LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO "EL AYUNTAMIENTO".

DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ SU DEVOLUCIÓN DE ÉSTE.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" REINTEGRE A "EL CONTRATISTA" ALGÚN MONTO RETENIDO, NO SE GENERARÁ GASTO FINANCIERO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA NO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (DIEZ POR CIENTO), CUANDO ESTE LÍMITE SEA REBASADO "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

VIGESIMA SEGUNDA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 60 Y 62 DE "LA LEY", "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR LAS RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SURTIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA TERCERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 61 DE "LA LEY".

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY" Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRAT+ISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL CONTRATISTA LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A " EL CONTRATISTA" **DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABLES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE EMITA LA RESPECTIVA RESOLUCION** EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABLES

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.




**OPERADO
FORTALECE**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016



A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILIS A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DEL "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA CUARTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TEMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O POR CASO FORTUITO O POR FUERZA MAYOR SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 60 ULTIMO PARRAFO Y EL ARTICULO 62 DE "LA LEY".

VIGESIMA QUINTA: SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN "LA LEY" Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.- "EL AYUNTAMIENTO", TENDRAN EN ESTE CONTRATO LA INTERVENCION QUE LE SEÑALAN LAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN EL ESTADO DE COLIMA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO, PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGESIMA OCTAVA: OBLIGACIONES DE BENEFICIO SOCIAL DE "EL CONTRATISTA".- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A LO SIGUIENTE:

I.- A COADYUVAR EN LA EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS BOSQUES COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERA PROVEER AL PERSONAL A SUS ORDENES DEL EQUIPO PROPIO PARA SU FIN. IGUALMENTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR AVISO A LA OFICINA FORESTAL MAS CERCANA, DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS EN LOS BOSQUES, DE SU LOCALIZACION Y MAGNITUD.

II.- A COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA.

III.- CUANDO POR CAUSAS NATURALES, TALES COMO SISMOS, CICLONES, CRECIMIENTO DE RIOS, SE DECLARE ESTADO DE DESASTRE EN ALGUN LUGAR DEL MUNICIPIO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLABORAR EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS URGENTES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NORMALES PRESTANDO PARA ELLO SU MAQUINARIA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE POR UN LAPSO DE 24 HORAS, A PARTIR DE QUE SEA SOLICITADO POR "EL AYUNTAMIENTO". VENCIDO EL PLAZO MENCIONADO SE ATENDERA A LO QUE SE CONVENGA.

IV.- QUE LA MANO DE OBRA A CONTRADA SEA ORIGINARIA EN LO POSIBLE DE LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS

V.- EL CONTRATISTA ACEPTA QUE A LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A.- El 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTOS DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

B.- EL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS DEL MUNICIPIO. (ART. 70 LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.).

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016



VIGÉSIMA NOVENA: NACIONALIDAD DEL CONTRATISTA.-EL CONTRATISTA DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO QUE FUE LEIDO Y ENTERADO DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN DE CONFORMIDAD EN TRES TANTOS LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL MISMO, EN LA CIUDAD DE COQUIMATLAN, COLIMA, EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2016



LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN, COL. 2015-2018
PRESIDENCIA

POR "EL AYUNTAMIENTO":



ING. JORGE ALEJANDRO MACÍAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA":

ING. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

"TESTIGOS DE ASISTENCIA"

OPERADO FORTALECE


LIC. YOLANDA JIMÉNEZ VIDRIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO RAMÍREZ FUENTES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

POR "LA SUPERVISIÓN DE OBRA"


ARQ. NESTOR IVÁN RAMÍREZ MÉNDOZA
SUPERVISOR DE OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

000417



IV.4 CONVENIO MODIFICATORIO (ART. 59 LOPSRM)

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

000523

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO
No. H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-C.A-001



CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. **H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-CA-001**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN, COL., A QUIEN SE LE DENOMINARA "**LA DEPENDENCIA**", REPRESENTADA POR EL LIC. **ORLANDO LINO CASTELLANOS** EN CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLAN, Y EL **ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION RESPECTIVAMENTE. Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ**, QUIÉN ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, SEGÚN CONSTA EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**", EL CUAL CONSIGNA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLUSULAS:

DECLARACIONES.

**OPERADO
FORTALECE**

AS PARTES DECLARAN QUE:

- 1).- CON FECHA **11 DE DICIEMBRE DE 2016** "**LA DEPENDENCIA**" CELEBRA EL CONVENIO ANTES MENCIONADO EN EL CUAL "**EL CONTRATISTA**" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LAS CLAUSULAS PRIMERA CONSISTENTE EN "**021/2016 PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR**", CON UN MONTO DE \$ **501,876.16** (QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100) I.V.A. INCLUIDO.
- 2).- EL CONTRATISTA ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SEÑALA QUE "**LA DEPENDENCIA**", PODRA MODIFICAR POR UNICA OCASIÓN DICHO CONTRATO, ESTIPULANDO EL PRECEPTO DE QUE SI TAL MODIFICACION NO REBASA EL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO O EL PLAZO O NO IMPLICA VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, PROCEDERA A CELEBRAR EL CONVENIO CON "**EL CONTRATISTA**"
- 3).- LAS PARTES RECONOCEN COMO SUYO EL CONTENIDO DEL CONTRATO QUE SE APLICA Y RATIFICAN LAS DECLARACIONES EN EL CONTENIDO DE DICHO VONVENIO.

"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

- 1).- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL ALCANCE ORIGINAL DE LOS TRABAJOS, DERIVADO DE CONCEPTOS QUE SURGIERON FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS, ESTO SIN REBASAR EL MONTO AUTORIZADO.

"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- 1).- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

DECLARADO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES SE SOMENTE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

000530

CLAUSULAS

PRIMERA.- SE AUMENTA EL MONTO DEL CONTRATO A LA CANTIDAD DE \$ 2,966,704.65 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 65/100) I.V.A. INCLUIDO CONSEQUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO: LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL ALCANCE ORIGINAL DERIVADO ESTO DE LA NECESIDAD CONCEPTOS QUE SURGIERON FUERA DE CATALOGO DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA Y QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2016 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 REALIZANDOLOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y PRESUPUESTO APROBADO POR "LA DEPENDENCIA", Y QUE FIRMADO FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONVENIO.

CUARTA.- NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO PARA EL INICIO DEL PRESENTE CONVENIO.

QUINTA.- "EL CONTRATISTA" MODIFICARA SEGUN CORRESPONDA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO QUE FUE OTORGADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARA A "LA DEPENDENCIA" UNA POLIZA DE FIANZA ADICIONAL EN LA QUE SE DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, SE FIRMA POR LOS QUE EN EL INTERVIENE EN UN TANTO, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. A LOS 11 ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS
Presidente Municipal

POR LA DEPENDENCIA

ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS
Director de obras Públicas

POR EL CONTRATISTA

C. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
Empresa: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

**OPERADO
FORTALECE**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

000531



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN, COLIMA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO



RECIBO DE PAGO DE ESTIMACION

OBRA:	021/2016 "PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR."	ESTIMACION:	CONVENIO
CONCURSO:	LO-806004996-E8-2016	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
LUGAR:	COQUIMATLAN, COLIMA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA	\$ 2,124,852.29
		FECHA DEL CONTRATO:	03 DE OCTUBRE DE 2016

NO. DE CONTRATO: H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

CTA-010202-QM2

LUGAR Y FECHA:

COQUIMATLÁN, COL. A 13 DE DICIEMBRE DE 2016

BUENO POR :

\$469,308.40

RECIBI LA CANTIDAD DE		\$469,308.40
..... SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.	
EN PAGO DE LA ESTIMACION QUE SE INDICA POR LOS TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO		
COMPRENDIDO 11 DE DICIEMBRE DE 2016	AL	31 DE DICIEMBRE DE 2016
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LIQUIDACION:		
IMPORTE DE LA ESTIMACION A PRECIOS UNITARIOS		\$408,094.26
I.V.A. 16 %		\$65,295.08
SUMA		\$473,389.34
DEDUCCIONES		
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%		\$0.00
AMORTIZACION I.V.A. DE ANTICIPO 16 %		\$0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION 0.5 %		\$2,040.47
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0.5 %		\$2,040.47
SUMA		\$4,080.94

RECIBE:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO

OPERADO POR
FORTALECE

IMPORTE A PAGAR \$469,308.40

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

Prof. Sergio Hernandez Torres
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN

000532




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA




EMPRESA: CASTILLO IRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CTA-010202-QM2
 ESTIMACION NO. : 5 CINCO
 FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
 NOMBRE DE LA OBRA: 021/2016 "PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR."
 PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CONTRATO No: H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

CARATULA DE ESTIMACION NO. 5

HOJA: 1 DE: 1

Nº.	ESTIMACION:	MONTO ACUMULADO DE ESTIMACIONES ANTERIORES A PRECIOS INICIALES	MONTO DE ESTA ESTIMACION A PRECIOS INICIALES	FACTORES DE ESCALAMIENTO AUTORIZADO				MONTO ESCALADO POR PARTIDA DE ESTA ESTIMACION	
				F1	F2	F3	F4		DE ESTA ESTIMACION
	021/2016 "PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUIN. CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR."		\$408,094.26						
 000538									
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION A PRECIOS INICIALES		\$0.00	\$408,094.26	IMPORTE POR ESCALAMIENTO EN EL PERIODO DE LAS PARTIDAS AUTORIZADAS EN ESTA ESTIMACION					
ESTADO CONTABLE		ESTADO CONTABLE		ANTICIPO				ESTADO CONTABLE DE LOS ESCALAMIENTOS	
IMPORTE CONTRATADO (INCLUYE IVA)		\$2,464,828.66	SALDO ANTERIOR (INCLUYE IVA)	\$0.00				ACUMULADO ANTERIOR	
ESTIMADO A LA FECHA (INCLUYE IVA)		\$473,389.34	AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION	\$0.00				EN ESTA ESTIMACION	
SALDO POR ESTIMAR (INCLUYE IVA)		\$1,991,439.32	SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00				TOTAL A LA FECHA	
AUTORIZA		ACEPTO		Vo. Bo.				Vo. Bo.	
ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR	ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CONTRATISTA	ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS DIRECTOR DE OBRA PUBLICA		Vo. Bo.				Prof. Sergio Hernandez Torres CONTRALORIA	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA

Coquimatlán
governa la gente
H. Ayuntamiento 2016-2018

EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y CIAADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2
ESTIMACION No. 5 CINCO
FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2016
UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA
PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No: H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

RESUMEN DE ESTIMACION CONVENIO

HOJA: 1 DE: 2

Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	H. GENERADOR No.	ESPECIFICACION	CANTIDAD EN OBRA			P.U.	IMPORTE		
					SEGUN. CATALOGO	TOTAL A LA FECHA	HASTA EST. ANTERIOR			DE ESTA ESTIMACION	
11	MODERNIZACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE SUR	M2			1,812.50	2,047.13	1,810.56	236.570 \$	255.33 \$	60,403.42	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL COLOR GRIS DE 20CM X 10CM DE ESPESOR DE Fc= 250KG/CM2 (TRAFICO PESADO) ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 8CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES Y AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
	BOCATORMENTA										
13	MURO DE PIEDRA A BASE DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA, 1:4; ACABADO COMÚN. INCLUYE, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3			45.00	33.80	0.00	33.800 \$	1,156.24 \$	39,080.91	
14	DALA DE 30 X 30 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO 2 CARAS, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML			55.00	45.20	0.00	45.200 \$	430.88 \$	19,475.78	
15	CONSTRUCCION DE REJILLA METALICA (INCLUYE MARCO), PARA BOCA DE TORMENTA DE 1.2 MTS DE ANCHO POR X DE LARGO. A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL (CANAL ESTRUCTURAL DE 4". MARCO DE ANGULO DE 4"X 1/4, SOLERAS DE 4"X 1/4). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTES CONCEPTO.	KG			5,100.00	3,529.42	0.00	3,529.420 \$	50.57 \$	178,482.77	
	OBSERVACIONES				"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"						
					IMPORTE DE ESTA HOJA:					\$297,442.88	
					ACUMULADO:					\$297,442.88	
											Vc. Bo.
											Vc. Bo.
											ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
											ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CONTRATISTA
											ING. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



RESUMEN DE ESTIMACION CONVENIO

EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y... DIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2
ESTIMACION No. 5 CINCO
FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2016
UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA
PERIODO DEL: 06 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 10 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No.: H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

HOJA: 2 DE: 2

Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	GENERADOR	ESPECIFICACION	SEGUN. CATALOGO	CANTIDAD EN OBRA			P.U.	IMPORTE
						TOTAL A LA FECHA	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
	MODERNIZACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE SUR									
	PRECIOS FUERA DE CATALOGO									
P.U EXTRA 01	RENIVELACION DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO 10X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 15 A 25 CM. INCLUYE: TAPA Y BROCAL BROCAL DE FIERRO FUNDIDO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA			0.00	5.00	0.00	5.000 \$	3,275.03 \$	16,375.15
P.U EXTRA 02	BANQUETA DE 8 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE .FC=150 KG/CM2. ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2			0.00	76.35	0.00	76.350 \$	204.63 \$	15,623.50
P.U EXTRA 03	GUARNICIÓN DE 15X35 CM DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2. INCLUYE: AFINE, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, CURADO CON CURAFEST, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA	ML			0.00	30.20	0.00	30.200 \$	180.84 \$	5,461.37
P.U EXTRA 04	LOSA DE CIMENTACION EN FONDO DE BOCATORMENTA, ARMADA CON ACERO DEL No. 4 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN ESPESOR DE 15 CMS, CON CONCRETO F C=200 KG/CM2. INCLUYE ARMADO, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	M2			0.00	18.72	0.00	18.720 \$	416.66 \$	7,799.88
P.U EXTRA 05	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 4.50 m DE ANCHO, TRANSVERSAL AL EJE DE VIALIDAD, Y 20 CMS EN INICIO A 31 CMS EN LA SECCION MAS ALTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-66-6 Y CONCRETO f'c= 250 kg/cm2. TERMINADO RAYADO. CORTE CON DISCO, MEMBRANA DE CURADO, PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, MATERIAL Y MANO DE OBRA."	M2			93.00	103.89	0.00	103.890 \$	629.43 \$	65,391.48
<p>OPERADO FORTALECE</p> <p>Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el Desempeño Social.</p>										
OBSERVACIONES						IMPORTE DE ESTA HOJA: \$110,651.38				
						ACUMULADO: \$408,094.26				
AUTORIZA			CONFORME			Vo. Bo.			Vo. Bo.	
ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR			ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CONTRATISTA			ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS DIRECTOR DE OBRA PUBLICA			PROF. SERGIO HERNANDEZ CONTRALORIA	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2
FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA
PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No: H.COG.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.
ESTIMACION CONVENIO

GENERADOR DE OBRA CONVENIO

HOJA: 1 DE: 24

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		ALTIMETRIA	PZA	ANCHO PROMEDIO	LONGITUD	AREA	UNIDAD	TOTAL	OBSERV.
		EJE	TRAMO								
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL COLOR GRIS DE 20CM X 10CM DE ESPESOR DE Fc= 250KG/CM2 (TRAFICO PESADO) ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 8CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES Y AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	HIDALGO CONST. MORELOS 20-NOV	CONSTITUCION MORELOS FINAL			0.70	79.84			55.89	
						0.70	104.45			73.12	
						0.70	83.56			58.49	
						0.70	70.10			49.07	
ESPACIO ENTRE EL CARRIL DE CONCRETO Y CAMELLON											
OPERADO FORTALECE											
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"											
										236.570	M2
SEGÚN CATALOGO		TOTAL A LA FECHA		HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		CANTIDAD ADICIONAL			
2863.75		1361.33		1124.76		236.57		0.00			
		ACEPTO								V6. Bc.	
ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR										PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN	

000537



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



Coquimatlán
Ayer y hoy



EMPRESA:
R.F.C.:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No.:


CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A. 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA
11 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COG.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 2 DE: 24

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL COLOR GRIS DE 20CM X 10CM DE ESPESOR DE Fc= 250KG/CM2 (TRAFICO PESADO) ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 8CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES Y AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

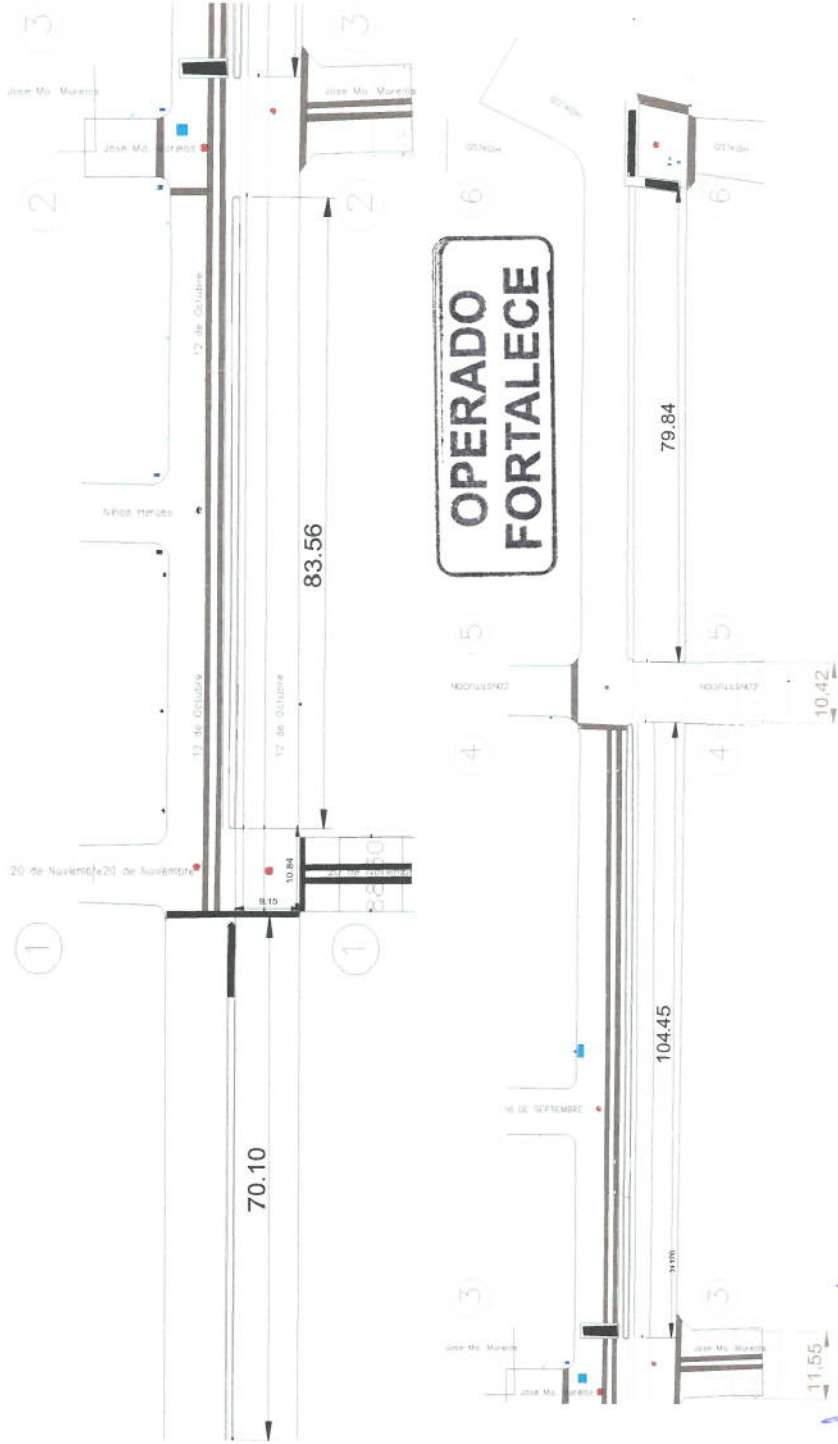

AUTORIZA
[Signature]
ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO

Va. Bo.
[Signature]

ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



Coquimatlán
Fundada el 20 de Mayo de 1828



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2
FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA
PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No: H.CCQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

FOTOS

HOJA: 3 DE: 24

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL COLOR GRIS DE 20CM X 10CM DE ESPESOR DE Fc= 250KG/CM2 (TRAFICO PESADO) ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 8CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES Y AJUSTES. DESPERDICIOS. LIMPIEZA. COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

OPERADO FORTALECE

AUTORIZA
ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO
ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Vó. Bo.
PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN

000539



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

RFC: CTA-010202-QM2

FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016

UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA

PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATO No: H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

GENERADOR DE OBRA CONVENIO

HOJA: 1 DE: 24

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		ALTURA	PZA	ANCHO PROMEDIO	LONGITUD	AREA	UNIDAD	TOTAL	OBSERV.
		EJE	TRAMO								
12	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 4.50 m DE ANCHO, TRANSVERSAL AL EJE DE VIALIDAD, Y 20 CMS EN INICIO A 31 CMS EN LA SECCION MAS ALTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/6-6 Y CONCRETO fc= 250 kg/cm2, TERMINADO RAYADO, CORTE CON DISCO, MEMBRANA DE CURADO, PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, MATERIAL Y MANO DE OBRA."	20 DE NOVIEMBRE				3.00	7.78			23.34	
		MORELOS				3.00	8.17			24.51	
		CONSTITUCION				3.00	9.31			27.93	
		HIDALGO				3.00	9.37			28.11	
ESPACIO ENTRE EL CARRIL DE CONCRETO Y CAMELLON											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> OPERADO FORTALECE </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social" </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 103.890 M2 </div>											
SEGUN CATALOGO		TOTAL A LA FECHA		HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		CANTIDAD ADICIONAL			
93.00		0.00		0.00		103.89		0.00			
ACEPTO											
 AUTORIZA ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR		 ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION									
 PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN											

000540



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLAN, COLIMA




EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2
FECHA: COQUIMATLAN, COL. A.07 DE DICIEMBRE DE 2016
UBICACIÓN: COQUIMATLAN, COLIMA
PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No: H.COO.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 2 DE: 24

CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 4.50 m DE ANCHO, TRANSVERSAL AL EJE DE VIALIDAD, Y 20 CMS EN INICIO A 31 CMS EN LA SECCION MAS ALTA. SEGUN DISEÑO. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/6-6 Y CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, TERMINADO RAYADO, CORTE CON DISCO, MEMBRANA DE CURADO, PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, MATERIAL Y MANO DE OBRA."

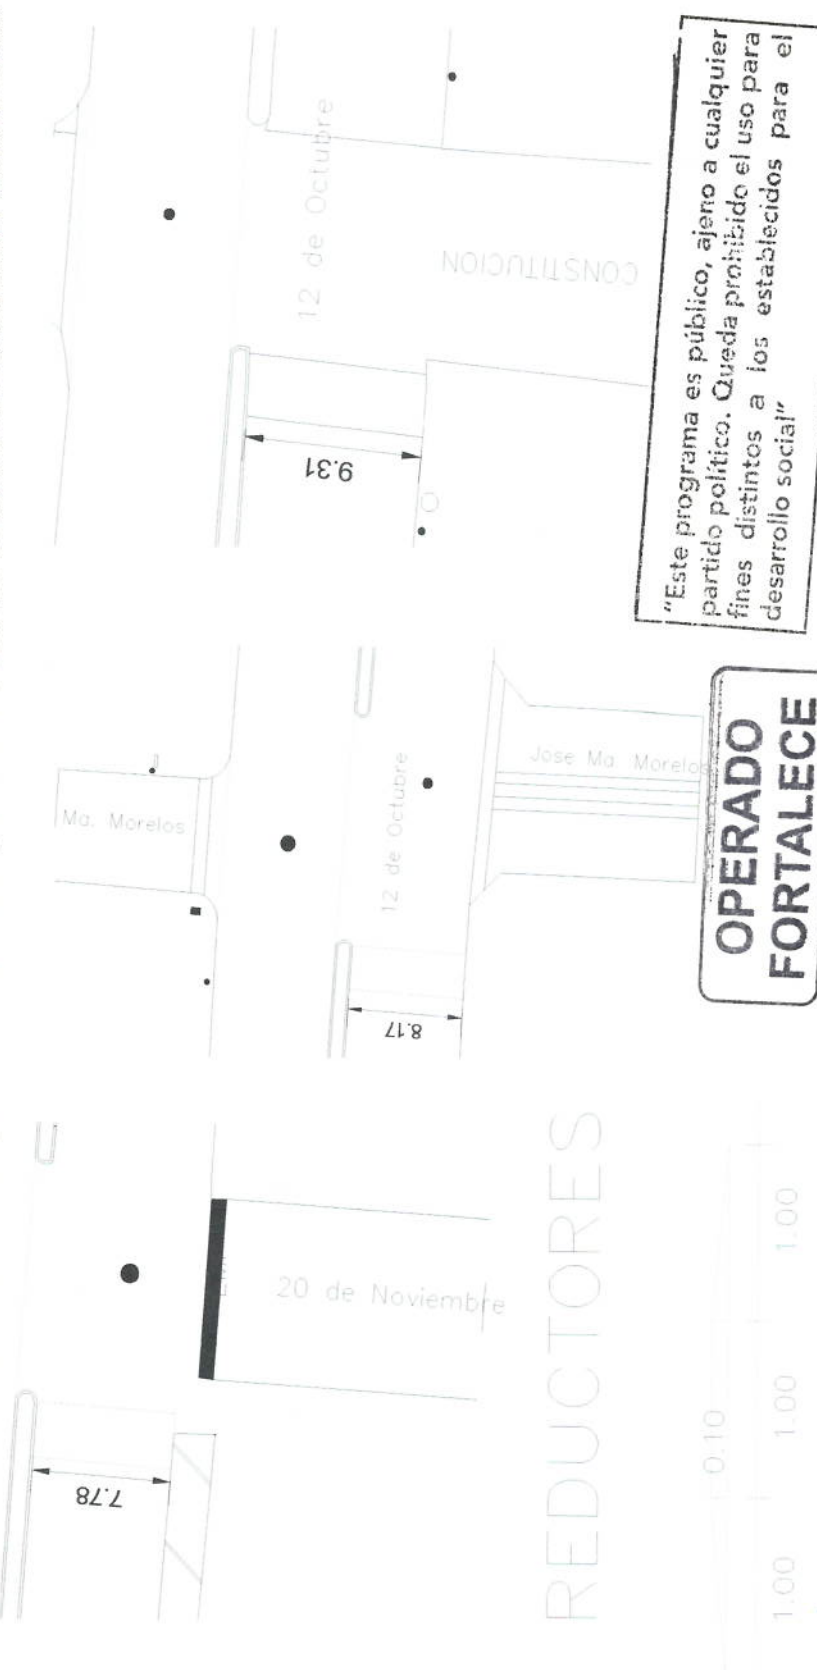

<p>AUTORIZA</p> <p>ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR</p>	<p>ACEPTO</p> <p>ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN</p>
--	--	--

000541



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2

COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA
11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COO.-FORTALECE-CONTRATO-02/1/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

FOTOS

HOJA: 3 DE: 24

CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 4.50 m DE ANCHO, TRANSVERSAL AL EJE DE VIALIDAD, Y 20 CMS EN INICIO A 31 CMS EN LA SECCION MAS ALTA, SEGUN DISEÑO. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/6-6 Y CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, TERMINADO RAYADO, CORTE CON DISCO, MEMBRANA DE CURADO, PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, MATERIAL Y MANO DE OBRA."



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

**OPERADO
FORTALECE**

AUTORIZA

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO

ING. CESAR HERNANDEZ IBÁÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Ve. Bo.

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

000542



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA





EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2
FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA
PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No: H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

GENERADOR DE OBRA CONVENIO

HOJA: 1 DE: 24

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERV.
		EJE	TRAMO								
11	BOCATORMENTA MURO DE PIEDRA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA, 1:4; ACABADO COMÚN. INCLUYE, TRAZO Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	BOCATORMENTA 1	CALLE MORELOS	0.80	0.50	0.65	0.80	10.40	2	10.82	
		BOCATORMENTA 2	CALLE 20 DE NOVIEMBRE	0.80	0.50	0.65	0.80	0.90	2	0.94	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;"> OPERADO FORTALECE </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;"> "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social" </div>											
<div style="background-color: yellow; padding: 2px; display: inline-block; margin: 10px;"> 33.800 M3 </div>											
		SEGÚN CATALOGO	TOTAL A LA FECHA	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	CANTIDAD ADICIONAL					
		2863.75	1158.56	1124.76	33.80	0.00					
		ACEPTO			Vc. Bo.						
		 ARQ. NÉSTOR IVAN RAMÍREZ MENDOZA SUPERVISOR			ING. CESAR HERNÁNDEZ IBÁÑEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION			 PROF. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN			

000543



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



Coahuila
Coahuila
Coahuila



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No.:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA
11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 2 DE: 24

MURO DE PIEDRA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA, 1:4; ACABADO COMÚN. INCLUYE, TRAZO Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



000544

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

AUTORIZA

ACEPTO

Vo. Bo.

ARQ. NESTOR IVAN RAMÍREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ING. CESAR HERNANDEZ IBÁÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC:	CTA-010202-QM2
FECHA:	COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
UBICACIÓN:	COQUIMATLÁN, COLIMA
PERIODO DEL:	11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No.:	H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.



ESTIMACION CONVENIO

FOTOS

HOJA: 3 DE: 24

**OPERADO
FORTALECE**

MURO DE PIEDRA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA, 1:4; ACABADO COMÚN. INCLUYE, TRAZO Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

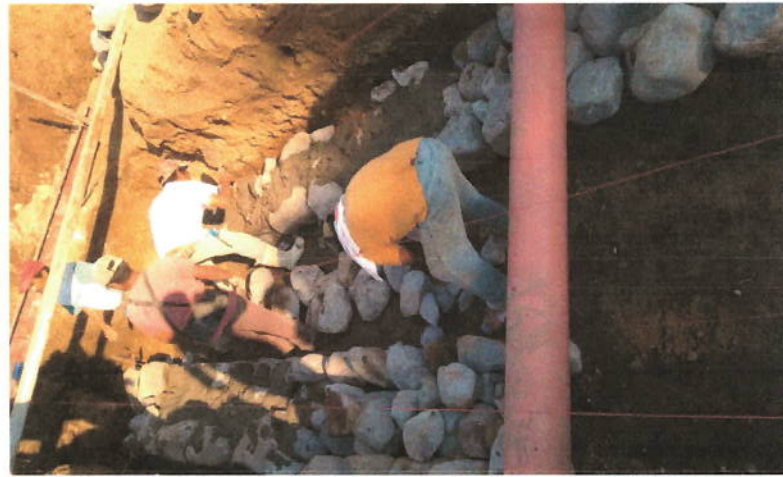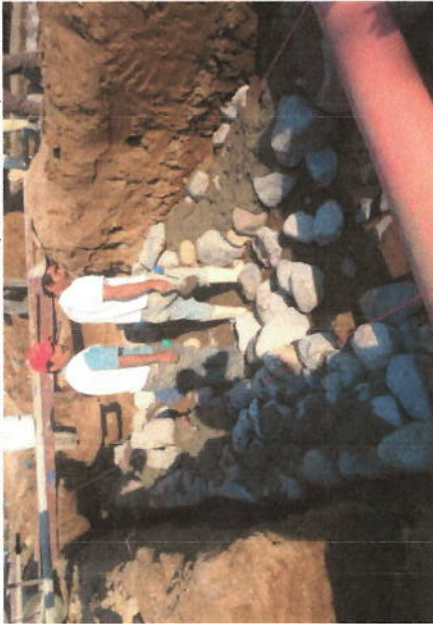

AUTORIZA

ARQ. NESTOR IVAN RAMÍREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO

ING. CESAR HERNANDEZ IBÁÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Ver. Bo.

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

000545



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA





EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2
FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA
PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No: H.COO.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

GENERADOR DE OBRA CONVENIO

HOJA: 1 DE: 24

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERV.	
		EJE	TRAMO									
14	BOCATORMENTA DALA DE 30 X 30 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO 2 CARAS, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	BOCATORMENTA 1	CALLE MORELOS					10.40 0.90	2 2	20.80 1.80		
		BOCATORMENTA 2	CALLE 20 DE NOVIEMBRE					10.40 0.90	2 2	20.80 1.80		
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-5deg); font-weight: bold; font-size: 1.2em;">OPERADO FORTALECE</div>												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-5deg); font-size: 0.8em;">"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"</div>												
		SEGUN CATALOGO	TOTAL A LA FECHA	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	CANTIDAD ADICIONAL						
		2863.75	1169.96	1124.76	45.20	0.00						
		ACEPTO				Vo. Bo.						
AUTORIZA  ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR		ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION				 PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN						

000546



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA

EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No.:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA


AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 2 DE: 24

DALA DE 30 X 30 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO.2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO 2 CARAS, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

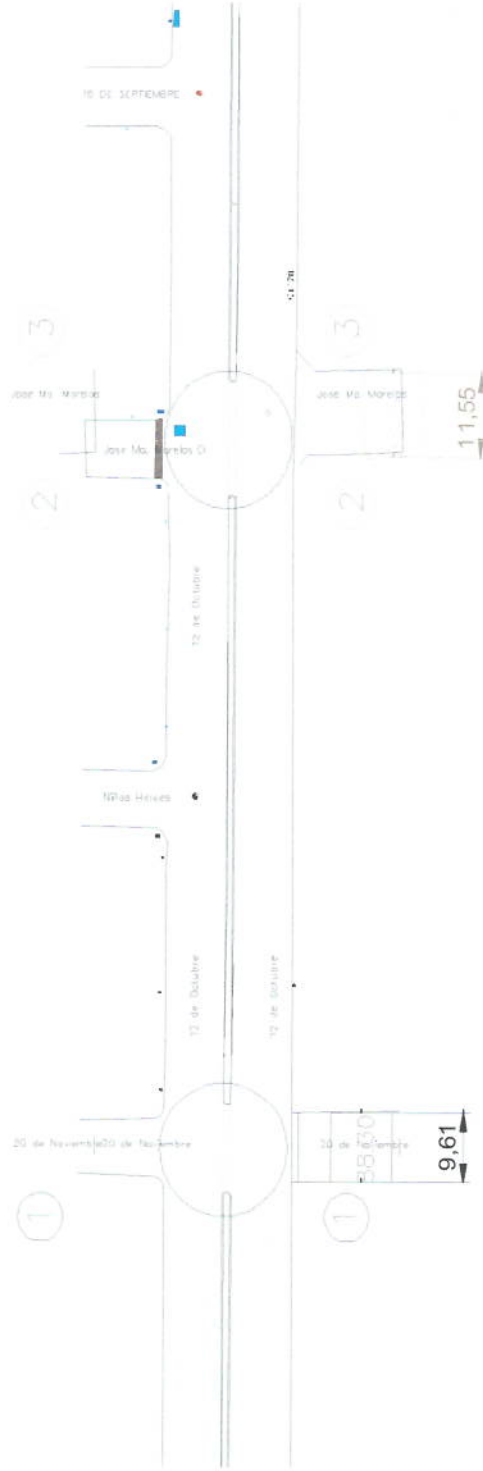

**OPERADO
FORTALECE**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

AUTORIZA

ACEPTO

Vo.Bo.

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

000547



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA
11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COG.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

FOTOS

HOJA: 3 DE: 24

DALA DE 30 X 30 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO.2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO 2 CARAS, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



**OPERADO
FORTALECE**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

AUTORIZA

ACEPTO

Vc. Bo.

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

ARQ. NESTOR IVÁN RAMÍREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000543



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CTA-010202-QM2
 UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
 COQUIMATLÁN, COLIMA
 PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CONTRATO No: H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.
ESTIMACION CONVENIO

GENERADOR DE OBRA CONVENIO

HOJA: 1 DE 24

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		ANCHO 1	ANCHO 2	KG/ML	CANTIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERV.
		EJE	TRAMO								
14	BOCATORMENTA CONSTRUCCION DE REJILLA METALICA (INCLUYE MARCO), PARA BOCA DE TORMENTA DE 1.2 MTS DE ANCHO POR X DE LARGO, A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL (CANAL ESTRUCTURAL DE 4" MARCO DE ANGULO DE 4"X 1/4, SOLERAS DE 4"X 1/4). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTES CONCEPTO.										
										1,763.87	
										0.42	
										0.28	
										0.14	
										1,764.71	
										1,764.71	
										3,529.420	KG

OPERADO FORTALECE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

SEGÚN CATALOGO	2863.75	TOTAL A LA FECHA	4654.18	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	1124.76	ESTA ESTIMACION	3529.42	CANTIDAD ADICIONAL	0.00
		ACEPTO						Vo. Bo.	
ARQ. NÉSTOR IVAN RAMÍREZ MENDOZA SUPERVISOR		ING. CESAR HERNANDEZ IBÁÑEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION						PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN	

000550



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



Coquimatlán
Ayuntamiento Constitucional



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No.:


CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA
11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COG.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 2 DE: 24

CONSTRUCCION DE REJILLA METALICA (INCLUYE MARCO), PARA BOCA DE TORMENTA DE 1.2 MTS DE ANCHO POR X DE LARGO, A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL (CANAL ESTRUCTURAL DE 4", MARCO DE ANGULO DE 4"X 1/4", SOLERAS DE 4"X 1/4), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTES CONCEPTO.

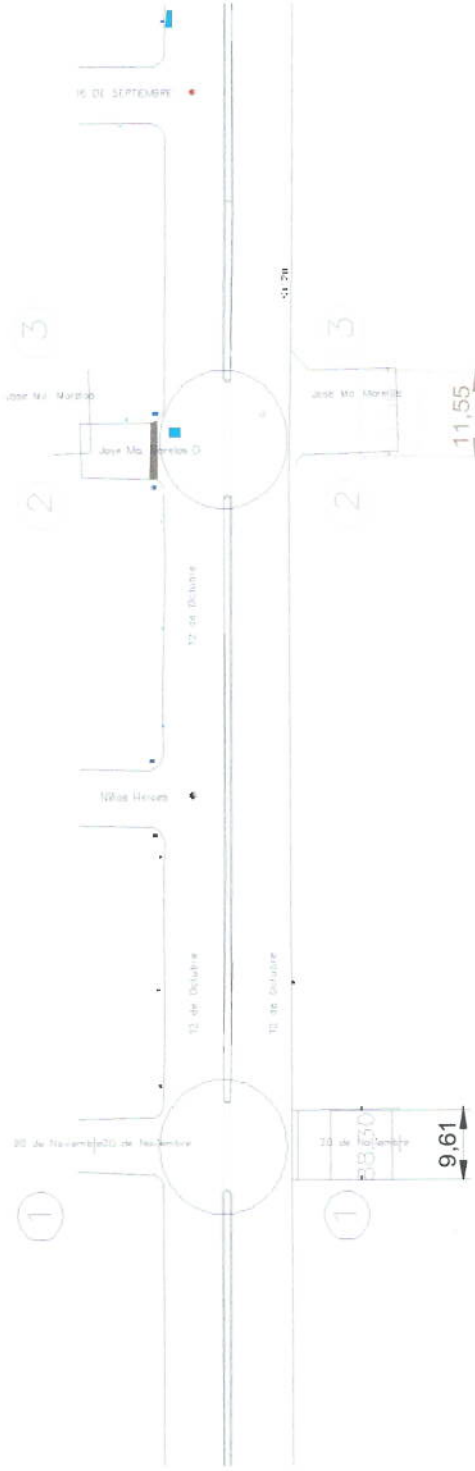

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

ACEPTO

AUTORIZA

V. Bo.

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN

000551



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CTA-010202-QM2
 FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
 UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA
 PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CONTRATO No: H.COQ-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.
ESTIMACION CONVENIO

GENERADOR DE OBRA CONVENIO

HOJA: 1 DE: 24

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		ANCHO 1	ANCHO 2	KG/M/L	CANTIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERV.
		EJE	TRAMO								
	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO 10X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 15 A 25 CM., INCLUYE: TAPA Y BROCAL BROCAL DE FIERRO FUNDIDO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CRUCE CALLE 20 DE NOVIEMBRE									1.00
		CRUCE CALLE MORELOS									1.00
		CRUCE CALLE CONSTITUCION									1.00
		CRUCE CALLE HIDALGO									2.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> OPERADO FORTALECE </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> <p>"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social!"</p> </div>											
<div style="background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;"> 5.000 PZA </div>											
		SEGÚN CATALOGO	TOTAL A LA FECHA	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	CANTIDAD ADICIONAL					
		2863.75	1129.76	1124.76	5.00	0.00					
		ACEPTO									
		AUTORIZA				Vo.Bo.					
		ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR				PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN					

000552



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 RFC: CTA-010202-QM2
 FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
 UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA
 PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CONTRATO No: H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.
ESTIMACION CONVENIO

FOTOS

HOJA: 3 DE: 24

CONSTRUCCION DE REJILLA METALICA (INCLUYE MARCO), PARA BOCA DE TORMENTA DE 1.2 MTS DE ANCHO POR X DE LARGO, A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL (CANAL ESTRUCTURAL DE 4", MARCO DE ANGULO DE 4"X 1/4). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTES CONCEPTO.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

OPERADO FORTALECE

Ver Bo.

ACEPTO

AUTORIZA

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ING. CESAR HERNANDEZ IBÁÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

000553



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COO.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 1 DE: 24

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO 10X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 15 A 25 CM, , INCLUYE: TAPA Y BROCAL BROCAL DE FIERRO FUNDIDO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

AUTORIZA

[Signature]

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO

[Signature]

Vo. Bo.

ING. CESAR HERNANDEZ IBÁÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

000534



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA

11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COG.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

FOTOS



HOJA: 3 DE: 24

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO 10X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 15 A 25 CM, , INCLUYE: TAPA Y BROCAL BROCAL DE FIERRO FUNDIDO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



**OPERADO
FORTALECE**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

<p>AUTORIZA</p>  <p>ARQ. NESTOR IVÁN RAMÍREZ MENDOZA SUPERVISOR</p>	<p>ACEPTO</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN</p>
--	---------------	---

000553



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA
11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

GENERADOR DE OBRA CONVENIO

HOJA: 1 DE: 24

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	CANTIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERV.
		EJE	TRAMO								
	BANQUETA DE 8 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 'FC=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			2.42	2.70	2.56 0.60		30.200 0.400	4.00	77.31 0.96	
<p style="text-align: center;">OPERADO FORTALECE</p> <p style="text-align: center;">"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"</p> <p style="text-align: right;">76.350 PZA</p>											
<p>AUTORIZA</p> <p>ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR</p>		<p>ACEPTO</p> <p>ING. CESAR HERNANDEZ IBÁÑEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION</p>		<p>HASTA ESTIMACION ANTERIOR</p> <p>1124.76</p>		<p>ESTA ESTIMACION</p> <p>76.35</p>		<p>CANTIDAD ADICIONAL</p> <p>0.00</p>		<p>Yo. Bo.</p> <p>PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN</p>	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA
11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COO.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 1 DE: 24

BANQUETA DE 8 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 'FC=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

PAROTA (FINAL DE CALLE)

CALLE 20 DE NOVIEMBRE



**OPERADO
FORTALECE**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

AUTORIZA

[Signature]
ARQ. NESTOR IVAN RAMÍREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO

[Signature]
Vo. Bo.
PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

030537



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



Coquimatlán
Ayuntamiento 2016-2021



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2
UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No: H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

FOTOS

HOJA: 3 DE: 24

BANQUETA DE 8 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 'FC=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"



OPERADO FORTALECE

AUTORIZA

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO

ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

000533



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:
RFC:
FECHA:

GASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2



UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No:

COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA
11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

GENERADOR DE OBRA CONVENIO

HOJA: 1 DE: 24

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	CANTIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERV.
		EJE	TRAMO								
	GUARNICIÓN DE 15X35 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: AFINE, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, CURADO CON CURAFEST, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRRANTE FUERA DE LA OBRA							30.200		30.20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>OPERADO FORTALECE</p> </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"</p> </div>											
<p>30.200 ML</p>											
SEGÚN CATALOGO		TOTAL A LA FECHA		HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		CANTIDAD ADICIONAL			
2863.75		1154.96		1124.76		30.20		0.00			
<p>AUTORIZA</p> 		<p>ACEPTO</p> 									
ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR		ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION								PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN	

000559



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2

FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016

UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA

PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATO No: H.COO.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 1 DE: 24

GUARNICIÓN DE 15X35 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: AFINE, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, CURADO CON CURAFEST, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA

PAROTA (FINAL DE CALLE)

**OPERADO
FORTALECE**



CALLE 20 DE NOVIEMBRE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

AUTORIZA

[Handwritten signature]

ARQ. NESTOR VAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO

[Handwritten signature]

ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

000500



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC:	CTA-010202-QM2
FECHA:	COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
UBICACIÓN:	COQUIMATLÁN, COLIMA
PERIODO DEL:	11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO No:	H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-02/12016-001 C.A.
ESTIMACION CONVENIO	

FOTOS

HOJA: 3 DE: 24

GUARNICIÓN DE 15X35 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: AFINE, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, CURADO CON CURAFEST, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL SOBROBRANTE FUERA DE LA OBRA



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

AUTORIZA

ARQ. NÉSTOR IVAN RAMÍREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO

ING. CESAR HERNANDEZ IBÁÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Vo.Bo.

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

000561



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



Coquimatlán
Ayuntamiento 2020B
gobierno



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

RF: CTA-010202-QM2

FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016

UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA

PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016


CONTRATO No: H.COG.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 1 DE 24

LOSA DE CIMENTACION EN FONDO DE BOCATORMENTA, ARMADA CON ACERO DEL No. 4 @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, CON UN ESPESOR DE 15 CMS, CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA

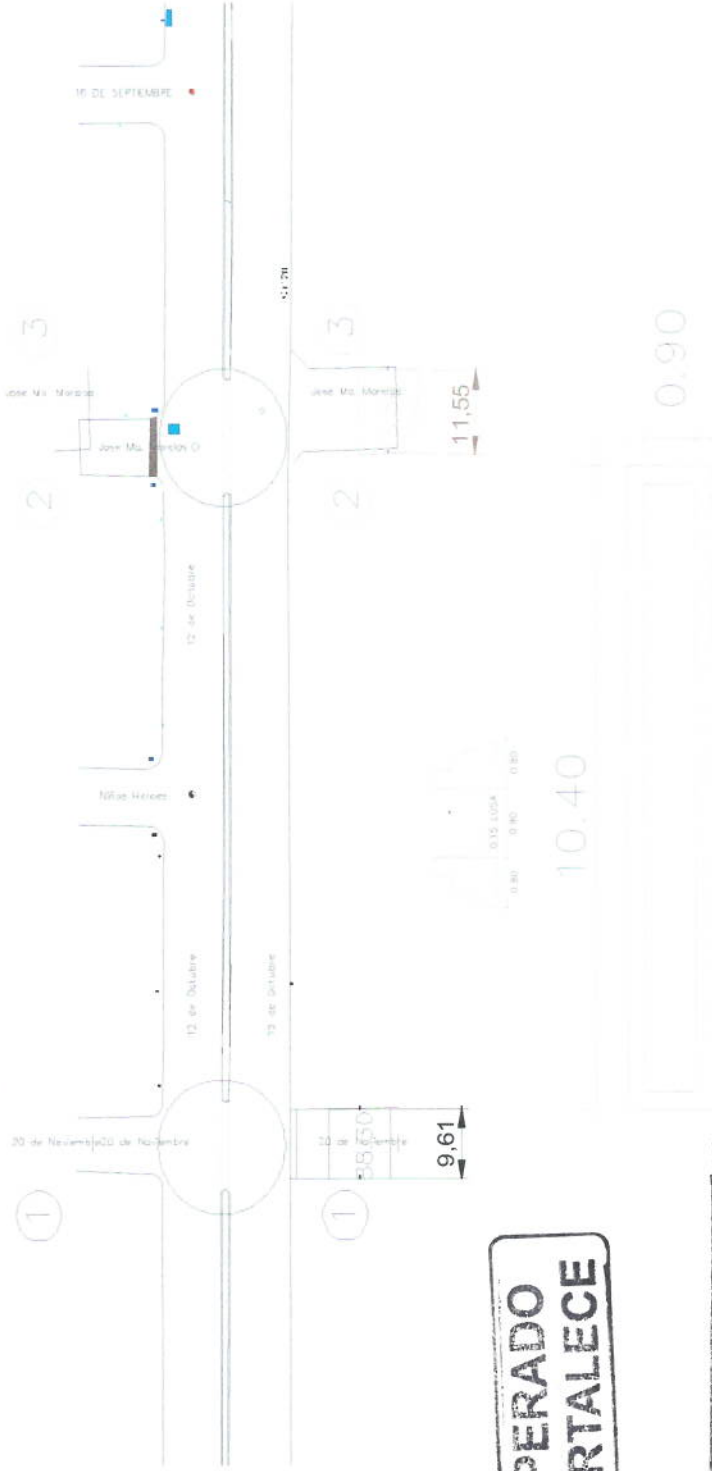

**OPERADO
FORTALECE**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

AUTORIZA

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ACEPTO

ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Vo.Bo.

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN

000503



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA


AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COO.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

FOTOS

HOJA: 3 DE: 24

LOSA DE CIMENTACION EN FONDO DE BOCATORMENTA, ARMADA CON ACERO DEL No. 4 @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, CON UN ESPESOR DE 15 CMS, CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA

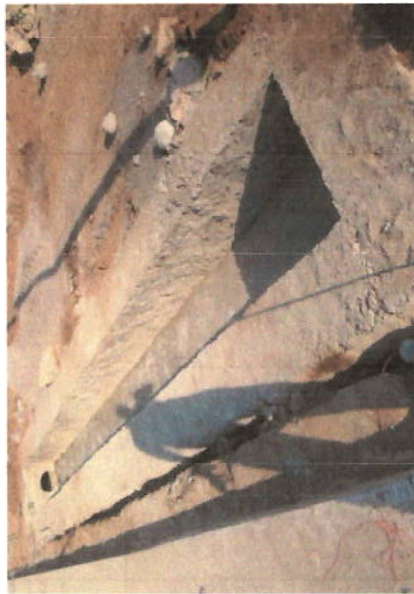

**OPERADO
FORTALECE**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

AUTORIZA

ACEPTO

Vo.Bo.

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN

000564



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



Coahuila
Coahuila
Coahuila



EMPRESA:

CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

RFC:

CTA-010202-QM2

FECHA:

COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016

UBICACIÓN:

COQUIMATLÁN, COLIMA

PERIODO DEL:

11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATO No:

H.COG.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

GENERADOR DE OBRA CONVENIO

HOJA: 1 DE 24

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	CANTIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERV.
		EJE	TRAMO								
	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE 15 X 35 CMS. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	PAROTA 20 DE NOV MORELOS	20 DE NOVIEMBRE MORELOS CONST.					68.680 83.000 103.810	2.00 2.00 2.00	137.36 166.00 207.62	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> OPERADO FORTALECE </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"</p> </div>											
<div style="background-color: yellow; padding: 2px;">510.980</div> ML											
		SEGÚN CATALOGO	TOTAL A LA FECHA	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	CANTIDAD ADICIONAL					
		ACEPTO			Vo. Bo.						
		 AUTORIZA ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR		 Vo. Bo. PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN							

000505



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA:
RFC:
FECHA:
UBICACIÓN:
PERIODO DEL:
CONTRATO No.:


CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CTA-010202-QM2
COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016
COQUIMATLÁN, COLIMA
11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

CROQUIS

HOJA: 1 DE: 24

DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE 15 X 35 CMS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA

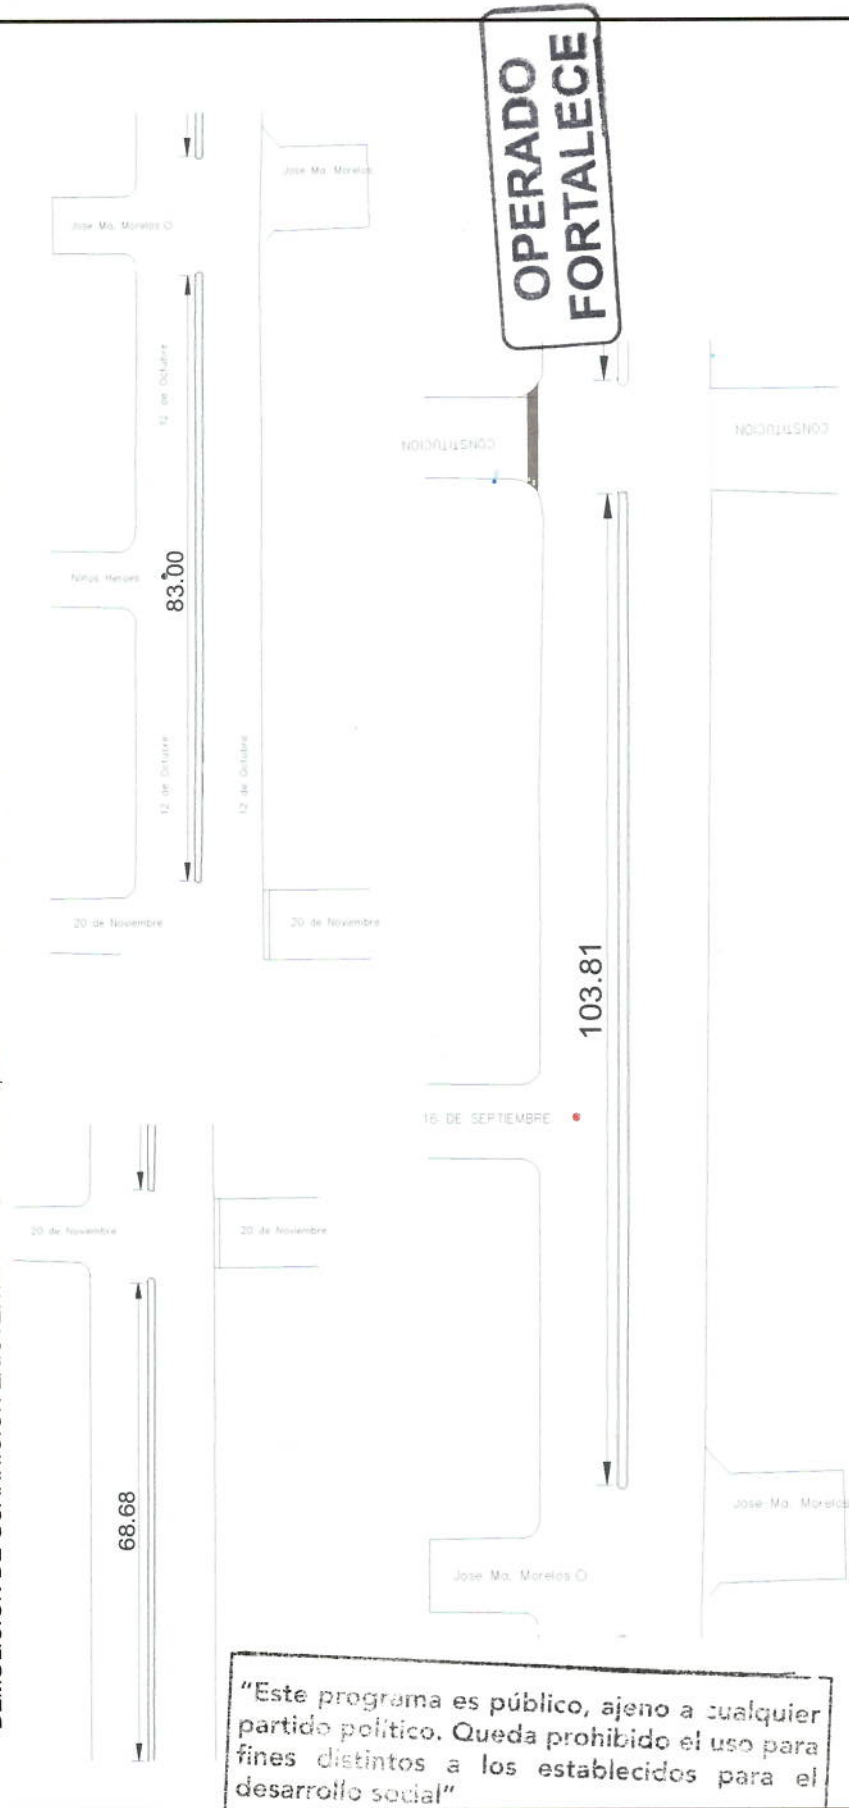

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

ACEPTO

Vo. Bo.

AUTORIZA

ARQ. NESTORIVAN RAMIREZ MENDOZA
SUPERVISOR

ING. CESAR HERNANDEZ IBÁÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES
CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN

(Handwritten signatures in blue ink)

000586



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN, COLIMA



EMPRESA: CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
RFC: CTA-010202-QM2

FECHA: COQUIMATLÁN, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2016

UBICACIÓN: COQUIMATLÁN, COLIMA

PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATO No: H.COO-FORTALECE-CONTRATO-021/2016-001 C.A.

ESTIMACION CONVENIO

FOTOS

HOJA: 3 DE: 24

DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE 15 X 35 CMS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

OPERADO FORTALECE

000507

AUTORIZA

ARQ. NESTOR IVAN RAMIREZ MENDOZA SUPERVISOR

ACEPTO

ING. CESAR HERNANDEZ IBANEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Vo.Bo.

PROF. SERGIO HERNANDEZ TORRES CONTRALOR H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN



IV.5 DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE EL CONVENIO MODIFICATORIO (ART. 99 RLOPSRM)

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal.

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.

030563



IV.6 AJUSTE DE COSTOS (ARTS. 56,57,58 LOPSRM)

“2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA”

000503

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.



Coquimatlán, Col. a 02 de Octubre de 2016

A quien corresponda

Por medio del presente se hace la aclaración referente al **Ajuste de costos**, documento correspondiente al anexo IV.6 del expediente de obra: **"Pavimentación concreto y adoquín calle 12 de octubre entre 20 de noviembre e Hidalgo carril Sur"**.

En relación a lo anterior, se notifica que para tal obra del ejercicio Fiscal 2016, este H. Ayuntamiento **NO** efectuó **Ajuste de costos**.



ATENTAMENTE

JORGE MACIAS



ING. JORGE ALEJANDRO MACÍAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO
COQUIMATLAN, COL.
2015-2018
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

**OPERADO
FORTALECE**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

Presidencia Municipal

000570



V.1 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN (CONTRATISTA-DEPENDENCIA) (ART. 64 LOPSRM)

000533

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.



CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LOPSRM

PROGRAMA FORTALECE

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 2 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, ESTANDO REUNIDOS EN LA UBICACIÓN DE LA OBRA, "**PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR**"; LOS -REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA **CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.** QUIEN FUNGE COMO PERSONA MORAL. Y EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, REPRESENTADA POR EL C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL PROF. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES CONTRALOR MUNICIPAL Y EL ARQ. NÉSTOR IVÁN RAMÍREZ MENDOZA, SUPERVISOR DE OBRA, QUIEN ENTREGA A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "**PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR**".

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

PROGRAMA: FORTALECE 2016

CONTRATO: No. H.COQ.-FORTALECE- CONTRATO-021/2016

IMPORTE (CON I.V.A. INCLUIDO) DEL CONTRATO: \$2,464,828.66

OPERADO FORTALECE

FIANZA DE ANTICIPO: 3720-10530-7 POR UN IMPORTE DE \$738,448.60

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: NO. 3720-10529-9 POR UN IMPORTE DE \$246,482.87

INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO CON CONTRATO: 03 DE OCTUBRE DE 2016.

TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO CON CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

INICIO REAL DE LA OBRA: 04 DE OCTUBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

IMPORTE FINAL EJECUTADO: \$ 2,966,704.82

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

No. DE ESTIMACION	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMADO	ACUMULADO	ESTIMADO	ACUMULADO
ESTIMACIÓN 1	\$364,163.57	\$364,163.57	\$251,775.16	\$251,775.16
ESTIMACIÓN 2	\$221,013.33	\$585,176.90	\$152,804.05	\$404,579.21
ESTIMACIÓN 3	\$1,312,338.31	\$1,897,515.21	\$907,323.56	\$1,306,902.77
ESTIMACIÓN 4	\$474,167.12	\$2,371,682.33	\$327,850.08	\$1,634,752.85

EL CONTRATISTA **CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.** QUIEN FIGURA COMO PERSONA MORAL, Y EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE

000534



CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

COQUIMATLÁN, DECLARAN, QUE SE ENTREGAN LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO POR AMBAS PARTES.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, Y CONTRATISTA. HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDO, ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBLIGADOS A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACIÓN, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.

LEÍDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO, ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR CONTRATISTA:

RECIBIDO POR:

ING. RODOLFO CASTILLO
HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL, CATILLO
TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ING. JORGE ALEJANDRO MACÍAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

TESTIGOS

ARQ. NÉSTOR IVÁN RAMÍREZ
MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA

PROF. SERGIO HERNÁNDEZ
TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

**OPERADO
FORTALECE**



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos para el desarrollo social"

MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 FRACCION DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO 2016 PARA FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION FISICA A LA COMUNIDAD DEL ESPACIO PUBLICO DENOMINADO "PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR", CON NUMERO DE AUTORIZACION POR PARTE DEL PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO 2016 UBICADO EN LA COLONIA SAN MIGUEL SOBRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO, SIENDO EJECUTOR DE LOS RECURSOS EL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, CON EL CONTRATO NUMERO H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016 REALIZADOS POR LA EMPRESA CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

LA "PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR" FUE AUTORIZADA Y APROBADA POR ESTE AYUNTAMIENTO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FORTALECE EJERCICIO 2016 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTADO DEL 2016.

I.-LUGAR FECHA Y HORA.

En la ciudad de coquimatlan, municipio del mismo nombre en el **estado de Colima**, siendo las **10:00** horas del día **31 de Diciembre del 2016**, el acto de entrega y recepción física del espacio público en mención a la comunidad, se reunieron en la **colonia San Miguel en el municipal de Coquimatlán**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II.-RELACION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MODERNIZACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUIN EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE SUR

- DEMOLICION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EXISTENTE PORMEDIOS MECÁNICOS, ASENTADO EN CAMA DE TIERRA, INCLUYE APILE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 100 MTS., PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: APILE Y SELECCIÓN DEL MATERIAL EXTRAIDO PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO.
- DEMOLICION DE EMPEDRADO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, ASENTADO EN CAMA DE TIERRA, INCLUYE APILE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 100MT, PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- TRAZO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO
- CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA NECESARIA Y ABUNDAMIENTO.
- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, HASTA EL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.
- CORTE EN CAJA EN AREA DE VIALIDADES, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO, ACARREOS LOCALES, APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y MANO DE OBRA.
- AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, CON EQUIPO MECANICO, COMPACTADA AL 95% PROCTOR INCLUYE , RIEGO DE AGUA CON PIPA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL BASE CARACTERISTICAS CORRESPONDIENTE A PROYECTO RELLENO, INCLUYE: AFINE Y COMPACTADO CON BAILARINA O CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS., PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.
- CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CONCRETO DE 3.00m DE ANCHO Y 20 cm DE ESPESOR, MR-45, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6, ACABADO TEXTURIZADO RAYADO, INCLUYE: SILLETA PIRAMIDAL SP 200 PARA RECUBRIMIENTO DE 5 CM. (SEGUN MUESTRA), PASAJUNTAS A BASE DE VARILLA LISA DE #5 DE 80cm DE LONGITUD A CADA 40 cm EN JUNTAS DE CONTRACCIÓN TRANSVERSALES NO PLANEADAS Y LAS DE CONSTRUCCIÓN @ 18 m Y JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN CON CORTADORA DE DISCO A CADA 3.00 m Y CALAFATEO CON SELLADOR ELASTOFEST (SEGUN DISEÑO), MEMBRANA DE CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL COLOR GRIS DE 20CM X 10CM DE ESPESOR DE Fc= 250KG/CM2 (TRAFICO PESADO) ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 8CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES Y AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
- CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE Fc= 150KG/CM2, SECCIÓN 10 X 20 CM., INCLUYE: EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, CIMBRADO, COLADO DE DENTELLON CON CONCRETO HECHO EN OBRA, RELLENOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

000536



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



- CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 4.50 m DE ANCHO, TRANSVERSAL AL EJE DE VIALIDAD, Y 20 CMS EN INICIO A 31 CMS EN LA SECCION MAS ALTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/6-6 Y CONCRETO $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, TERMINADO RAYADO, CORTE CON DISCO, MEMBRANA DE CURADO, PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
- PASO PEATONAL DE CONCRETO DE 1.20X0.18M DE ESPESOR DE CONCRETO $f_c = 250 \text{ KG/CM}^2$ CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6, ACABADO TEXTURIZADO RAYADO, INCLUYE: MATERIAL, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, LIMPIEZA.
- RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO 10X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA DE 15 A 25 CM, DALA DE 20 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM ACABADO COMÚN O SIMILAR AL EXISTENTE (FINO), INCLUYE: TAPA Y BROCAL BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.
- EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN ZONA B, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, EXTRACCIÓN Y DEPOSITO A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA
- CARGA Y ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.
- ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. 3KM
- PLANTILLA DE CONCRETO $f_c = 100 \text{ KG/CM}^2$ DE 5 CMS DE ESPESOR
- MURO DE PIEDRA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA, 1:4; ACABADO COMÚN. INCLUYE, TRAZO Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- DALA DE 30 X 30 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE $f_c = 250 \text{ KG/CM}^2$, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO 2 CARAS, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- CONSTRUCCION DE REJILLA METALICA (INCLUYE MARCO), PARA BOCA DE TORMENTA DE 1.2 MTS DE ANCHO POR X DE LARGO, A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL (CANAL ESTRUCTURAL DE 4", MARCO DE ANGULO DE 4"X 1/4, SOLERAS DE 4"X 1/4), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO URBANA DE LED LUMINA MODELO SKY W40 , 100% ALUMINIO ANODIZADO Y ESTRUIDO LENTE DE POLICARBONATO 6440 LM CERTIFICADOS DEFINITIVO DE LA NOM 0-31 CONUE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

**OPERADO
FORTALECE**

000537



III.-IMPORTE CONTRACTUAL.

El importe contractual correspondiente al contrato numero H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-021/2016 siendo este de \$2, 464,828.66 (Dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos veintiocho pesos 66/100 m.n.)

IV.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **03 de octubre de 2016**

Fecha de terminación: **31 de diciembre de 2016**

Plazo de ejecución: **Noventa días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución

Fecha de inicio: **18 de julio de 2016**

Fecha de terminación: **15 de septiembre de 2016**

Plazo de ejecución: **Cincuenta y ocho días naturales**



ENTREGA POR LA ENTIDAD O DEPENDENCIA EJECUTORA



ING. JORGE ALEJANDRO MACÍAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

RECIBEN DE CONFORMIDAD
POR LA CONTRALORIA SOCIAL O REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA

FIRMA

Nombre: Juan Jesús Cárdenas Galván
Cargo: Presidente comité pro Obra.
Domicilio: 20 de Noviembre #509

Nombre: Heriberto Ruíz Araiza
Cargo: Tesorero comité pro Obra
Domicilio: 12 de Octubre #99

FIRMA

Nombre: Ma. Guadalupe Cabellos Santana
Cargo: Secretario del comité pro Obra.
Domicilio: 20 de Noviembre #518

Nombre: Epitacio Gutiérrez Alvarado
Cargo: Primer vocal del Comité
Domicilio: 20 de Noviembre #516

000535



C.P. Carlos Arturo Noriega Garcia
Secretario de planeación y finanzas del gobierno del estado de colima



Complemento del acta de integración de comité pro-obra
Programa fondo metropolitano 2016.

Presidente comité pro Obra. _____
Juan Jesús Cárdenas Galván

Secretario comité pro Obra. _____
Ma. Guadalupe Cabellos Santana

Tesorero comité pro Obra. _____
Heriberto Ruíz Araiza

Primer vocal comité pro Obra. _____
Epitacio Gutiérrez Alvarado

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la reunión, siendo las 16:30 horas del día de su fecha, levantándose las presente acta y firmándose por los participantes las su constancia.

000509



V.2 ACTA DE FINIQUITO (ART. 64 LOPSRM)

030530

"2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



FINIQUITO DE OBRA

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 PARRAFO SEGUNDO DE LA LOPSRM, 168 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.

PROGRAMA FORTALECE

OBRA: PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR.

EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA SIENDO 13:10 HORAS DEL DIA 02 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, ESTANDO REUNIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COQUIMATLÁN, PARA TRATAR EL ASUNTO DEL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. H.COQ. -FORTALECE- CONTRATO-021/2016 Y H.COQ. -FORTALECE- CONTRATO-021/2016.-CA DENOMINADO PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR.

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN Y EL CONTRATISTA CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. PERSONA MORAL, SE REÚNEN ESTE DIA CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RELATIVOS A LA OBRA DENOMINADA:

PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR.

LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y HOY SE HACE LA ENTREGA FORMAL DE SUS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. PERSONA MORAL, AL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, REPRESENTADO POR EL C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JORGE ALEJANDRO MACIAS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL PROF. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES CONTRALOR MUNICIPAL Y EL ARQ. NÉSTOR IVÁN RAMÍREZ MENDOZA, SUPERVISOR DE OBRA, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

PAVIMENTACIÓN CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR.

I.- IMPORTES:

IMPORTE CONTRACTUAL: \$2,464,828.66 INCLUYE IVA (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N.).

IMPORTE REAL EJECUTADO: \$2,966,704.82 INCLUYE IVA (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 82/100 M.N.).

CONVENIO ADICIONAL: \$501,876.16 INCLUYE IVA (QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.).

ADITIVA: N/A.

DEDUCTIVA: 5 AL MILLAR POR EL CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL IMPORTE SIN IVA.

DEDUCTIVA: 5 AL MILLAR POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS DEL IMPORTE SIN IVA.

IMPORTE DE AJUSTES DE COSTOS: N/A.

II.- PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONTRATO

03 DE OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

DIFERIDO

N/A.

CONVENIO

DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL"

OPERADO
FORTALECE

000591



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



\$0.00
INTERESES
\$0.00

VI.- RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS.

\$ 24,526.72 (VEINTICUATRO MIL QUINTOS VEINTISÉIS PESOS 72/100 M.N.)

Producto de las retenciones del 5 al millar. De Supervisión y Vigilancia, y Construcción y Mantenimiento de Áreas Recreativas.

VII.- AJUSTE DE COSTOS.

N/A.

VIII.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN RESCISIÓN DE CONTRATO

A.-) Importe de sanción por atraso de obra: N/A.

B.-) importe de penalizaciones por el incumplimiento al contrato: N/A.

C.-) Cargos por supervisión N/A.

No. DE FIANZAS Y FECHAS:

IMPORTES TOTALES MONTO A FAVOR DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COQUIMATLAN COLIMA

Fianza anticipo No. 3720-10520-7 del contrato por el 50% del total de los trabajos contratados, \$ 739,448.60 CON IVA incluido.

Fianza de cumplimiento No. 3720-10529-9 del contrato por el 10% del total de los trabajos contratados, \$ 246,482.87 CON IVA incluido.

Se asienta en este finiquito que adicionalmente se realizó la remodelación de Camellón 12 de Octubre, estando de acuerdo ambas partes firmantes y que la cantidad de \$1,726,800.88. Se cubrirá totalmente por este H. Ayuntamiento.

Se anexa, presupuesto de la obra.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

**OPERADO
FORTALECE**

Se hace constar por las partes que intervienen en este finiquito, que en este evento fue entregada la garantía de vicios ocultos la que queda a salvo para cualquier vicio oculto que se presente.

Sin otro particular firman los participantes a este acto de cierre y Finiquito de la obra en referencia.

CONTRATISTA:

"MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN"

ING. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JORGE ALEJANDRO MACÍAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

La presente hoja de firmas corresponde al Acta Finiquito de Obra o Servicios conforme al Art. 64 párrafo segundo de la LOPSRM, 168 Y 170 del Reglamento de la LOPSRM, del contrato No. H.COQ.-FORTALECE-CONTRATO-016/2016 con el contratista CONSTRUCTORA CONTINENTAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V., PERSONA MORAL., dentro del marco del PROGRAMA FORTALECE 2016.

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.

000592

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



PERIODO DE AJUSTE DE COSTOS

N/A.

III.- IMPORTE DE OBRA EJECUTADA

A N E X O S:

IMPORTE DE OBRA ESTIMADA:

\$2,371,712.33 INCLUYE IVA (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 33/100 M.N.).

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

No. DE ESTIMACION	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMADO	ACUMULADO	ESTIMADO	ACUMULADO
ESTIMACIÓN 1	\$364,163.57	\$364,163.57	\$251,775.16	\$251,775.16
ESTIMACIÓN 2	\$221,013.33	\$585,176.90	\$152,804.05	\$404,579.21
ESTIMACIÓN 3	\$1,312,338.31	\$1,897,515.21	\$907,323.56	\$1,306,902.77
ESTIMACIÓN 4	\$474,167.12	\$2,371,682.33	\$327,850.08	\$1,634,752.85

CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES:

SALDO RESULTANTE:

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁN LIQUIDADOS:

LA INVERSION TOTAL EJERCIDA EN LA PRESENTE OBRA FUE APORTADA MEDIANTE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FORTALECE
2016	\$2,966,704.82	\$2,966,704.82

IV.- SANCIONES Y CARGOS ADICIONALES

CARGOS POR SUPERVISIÓN

\$ 0.00

Estimación final.

PENAS CONVENCIONALES A FAVOR DE LA DEPENDENCIA

\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.

IMPORTE ANTICIPO OTORGADO

\$739,448.60

V.- SOBRECOSTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR DE SER EL CASO ARTICULO 62 FRACCION II DE LA LOPSRM Y 162 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.

N/A.

SALDO POR AMORTIZAR

Presidencia Municipal

Reforma S/N y Jesús Alcaraz, Coquimatlán, Col. Tel: 32-30-333 32-30-748, C. Postal 28400.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL"
